

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE VAPOR PLANTA AUSTRAL – COISHCO AUSTRAL GROUP S.A.A COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ	Proveedor: IC AMPER		
	Cliente: AUSTRAL GROUP		
	Rev. 01	Fecha: 18/05/24	

INFORME SEMANAL PROYECTO LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADO #01
O.S 70062173

DIRIGIDO A : Ing. Iván Tasayco
SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS – AUSTRAL GROUP S.A.A
“COISHCO”

Ing. Gustavo Mendoza
JEFE DE PROYECTOS – AUSTRAL GROUP S.A.A “COISHCO”

DE : Arq. Jorge Gavidia
SUPERVISOR DE PROYECTO – IC AMPER S.A.C

ASUNTO : Levantamiento información y elaboración de planos de líneas de vapor y condensado

FECHA : Al 17 de mayo del 2024

1. OBJETIVO


Tener información completa tanto en planos como inventarios a lo que respecta a líneas de vapor y condensado de la planta de harina de Austral Group – Coishco

2. CRONOGRAMA DE AVANCE: EJECUCIÓN DE TRABAJOS

AVANCE EN EJECUCION DE TRABAJOS – RED DE VAPOR		
Item	Descripción	% Avance hasta el 17/05
1	ZONA 0: PLANOS GENERALES	0%
2	ZONA 1: SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR	67%
3	ZONA 2: SISTEMA DE VAPOR Y CONDESADOS EN COCINAS	0%
4	ZONA 3: LINEAS DE ALIMENTACION DE VAPOR Y CONDENSADO A SECADORES ROTADISCOS "FSD 60"	0%
5	ZONA 4: LINEAS DE ALIMENTACION DE VAPOR Y CONDENSADO A SECADORES ROTATUBOS	0%
6	ZONA 5: LINEAS DE ALIMENTACION DE VAPOR Y CONDENSADO DE ZONAS PERIFERICAS Y AUXILIARES	0%
TOTAL:		18%

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE VAPOR PLANTA AUSTRAL – COISHCO AUSTRAL GROUP S.A.A COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ	Proveedor: IC AMPER		
	Cliente: AUSTRAL GROUP		
	Rev. 01	Fecha: 18/05/24	

3. AVANCE DE TRABAJOS: CURVA “S” (comparación ejecutada con lo proyectado)

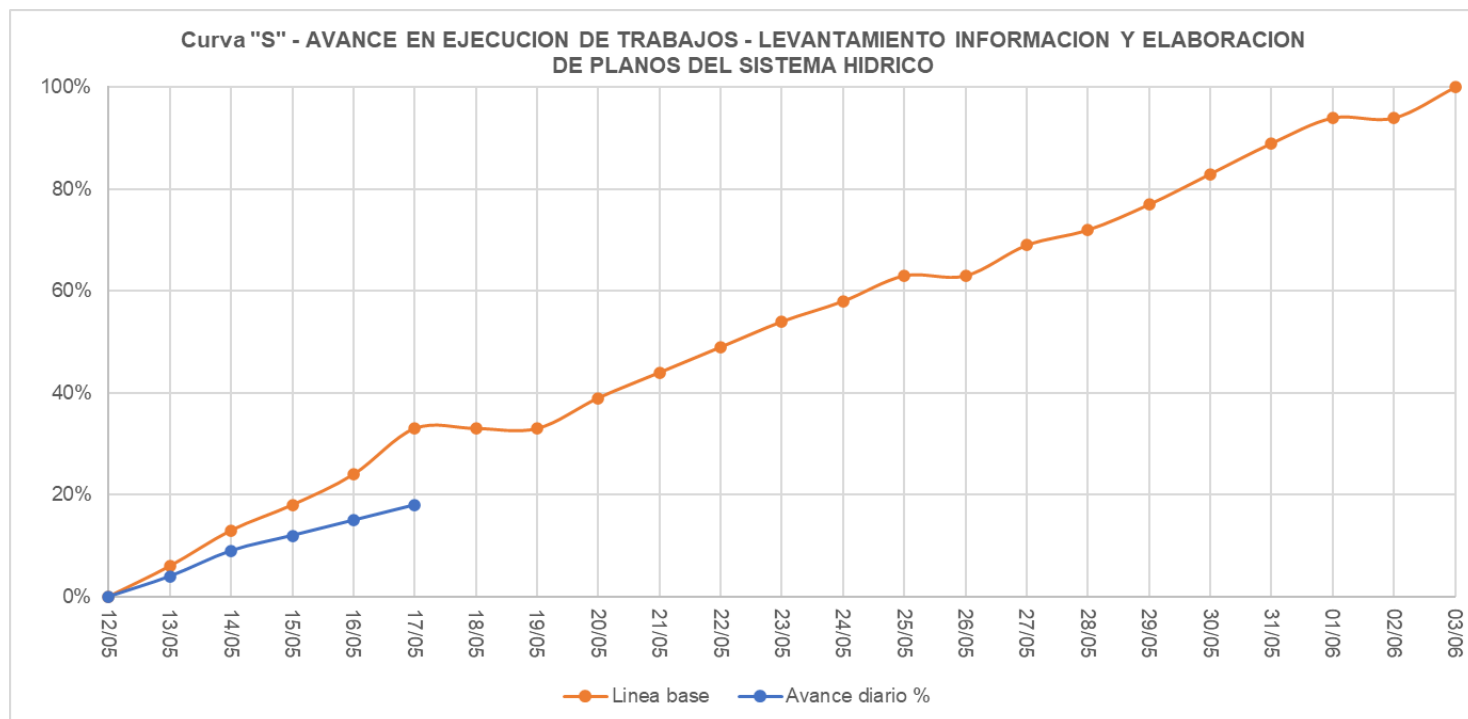

4. HORAS - HOMBRE EMPLEADAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PLANIFICADOS

HORAS-HOMBRE EMPLEADAS EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS				
Del 13/05 al 17/05	H-H SUPERVISOR	H-H PREVENCIONISTA	H-H EJECUCIÓN	TOTAL H-H
H-H planificadas	48	48	96	192
H-H empleadas para ejecución	48.5	48.5	97	194
H-H empleadas para trabajos no previstos (horas extras)	0.5	0.5	1	2
RESUMEN HORAS-HOMBRE ACUMULADAS				
ACUMULADO al 17/05	H-H SUPERVISOR	H-H PREVENCIONISTA	H-H EJECUCIÓN	TOTAL H-H
H-H planificadas	48	48	96	192
H-H empleadas para ejecución	48.5	48.5	97	194
H-H empleadas para trabajos no previstos (horas extras)	0.5	0.5	1	2

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE VAPOR PLANTA AUSTRAL – COISHCO AUSTRAL GROUP S.A.A COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ	Proveedor: IC AMPER		
	Cliente: AUSTRAL GROUP		
	Rev. 01	Fecha: 18/05/24	

5. RELACIÓN DE PLANOS CONCLUIDOS

5.1. EN LA ZONA 1: SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - CALDERAS DE VAPOR SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PLANOS

PLANOS CONCLUIDOS A REVISIÓN

- ESQUEMA DE PRINCIPIO - CONEXIÓN LINEAS VAPOR, AGUA BLANDA, AGUA DE REPOSICION PARA TANQUE DESAIREADOR
- ISOMETRICO - CONEXIÓN LINEAS VAPOR, AGUA BLANDA, AGUA DE REPOSICION PARA TANQUE DESAIREADOR
- P&ID - CONEXIÓN LINEAS VAPOR Y AGUA BLANDA PARA TANQUE DESAIREADOR
- ESQUEMA DE PRINCIPIO - TANQUE DESAIREADOR ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS
- P&ID - TANQUE DESAIREADOR ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS Y SALIDA DE PURGAS CONDENSADO
- ESQUEMA DE PRINCIPIO - CONEXIÓN LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR N°4, N°5 Y N°6 (1500 BHP) HASTA MANIFOLD N°1 EN SALA DE CALDERAS
- ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TK FLASH N°1 (ZONA CALDEROS)


PLANOS AL 80 y 90%

- DISTRIBUCION DE LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADO - CALDERAS DE VAPOR Y TANQUE DESAIREADOR
- ISOMETRICO - TANQUE DESAIREADOR ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS
- ESQUEMA DE PRINCIPIO - CONEXIÓN LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR DE CALDEROS N°1(2000BHP), N°2 Y N°3 (900BHP) HASTA MANIFOLD N°2 EN SALA DE CALDERAS
- ISOMETRICO - CONEXIÓN LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR DE CALDEROS N°1(2000BHP), N°2 Y N°3 (900BHP) HASTA MANIFOLD N°2 EN SALA DE CALDERAS
- ISOMETRICO - CONEXIÓN LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR N°4, N°5 Y N°6 (1500 BHP) HASTA MANIFOLD N°1 EN SALA DE CALDERAS

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE VAPOR PLANTA AUSTRAL – COISHCO AUSTRAL GROUP S.A.A COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ	Proveedor: IC AMPER		
	Cliente: AUSTRAL GROUP		
	Rev. 01	Fecha: 18/05/24	


6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

RECOPILACION DE DATOS EN CAMPO, PLANTA AUSTRAL COISHCO

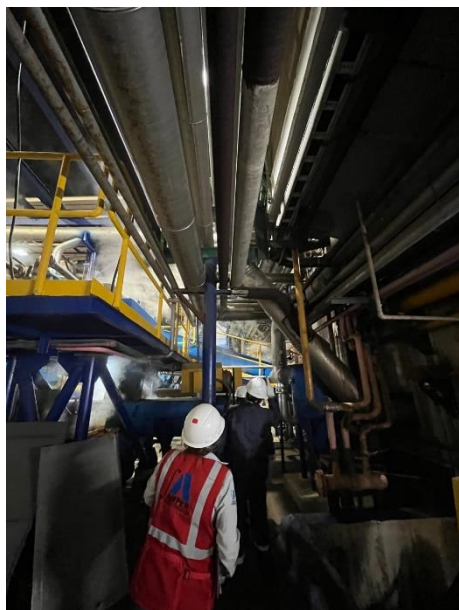


RELACION DE PLANOS CONCLUIDOS

- ESQUEMA DE PRINCIPIO - CONEXIÓN LINEAS VAPOR, AGUA BLANDA, AGUA DE REPOSICION PARA TANQUE DESAIREADOR

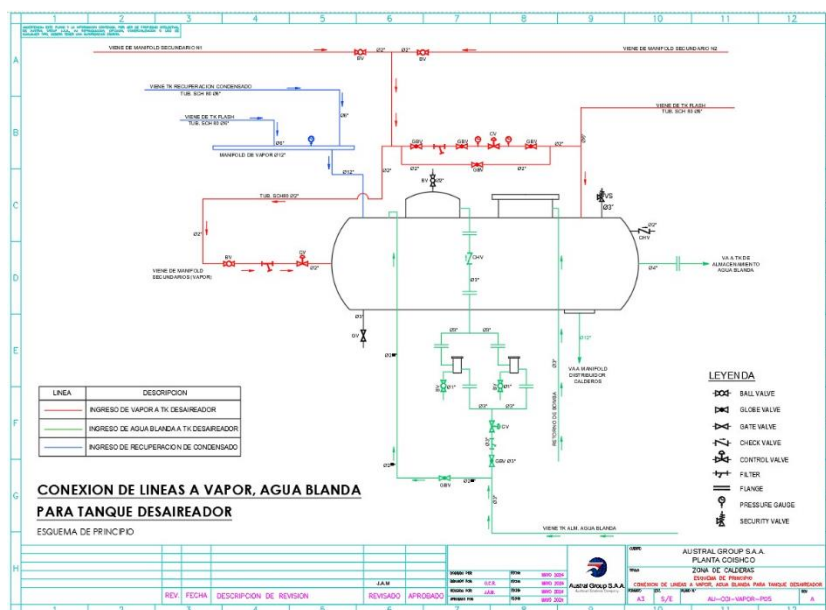

- ISOMETRICO - CONEXIÓN LINEAS VAPOR, AGUA BLANDA, AGUA DE REPOSICION PARA TANQUE DESAIREADOR

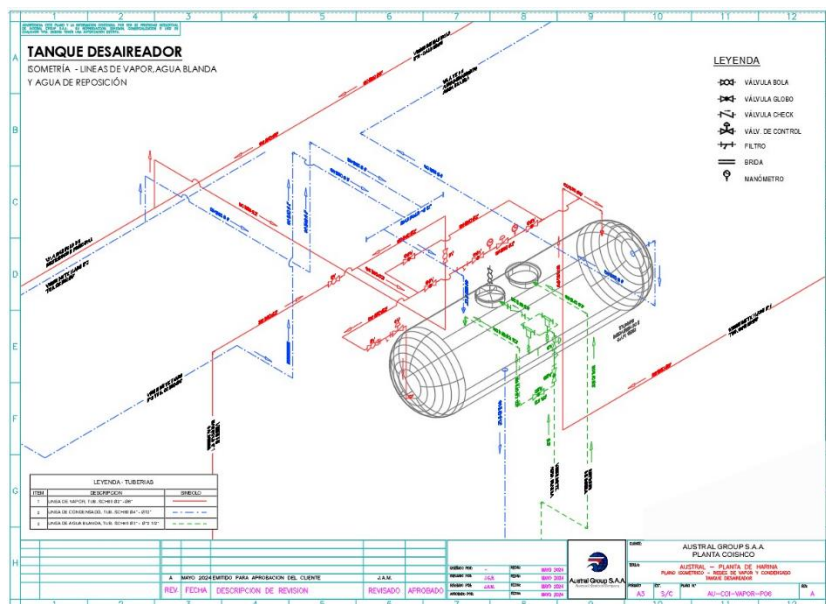

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE VAPOR

PLANTA AUSTRAL – COISHCO

AUSTRAL GROUP S.A.A
COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ

Proveedor: IC AMPER


Cliente: AUSTRAL GROUP

Rev. 01


Fecha: 18/05/24



- P&ID - CONEXIÓN LINEAS VAPOR Y AGUA BLANDA PARA TANQUE DESAIREADOR

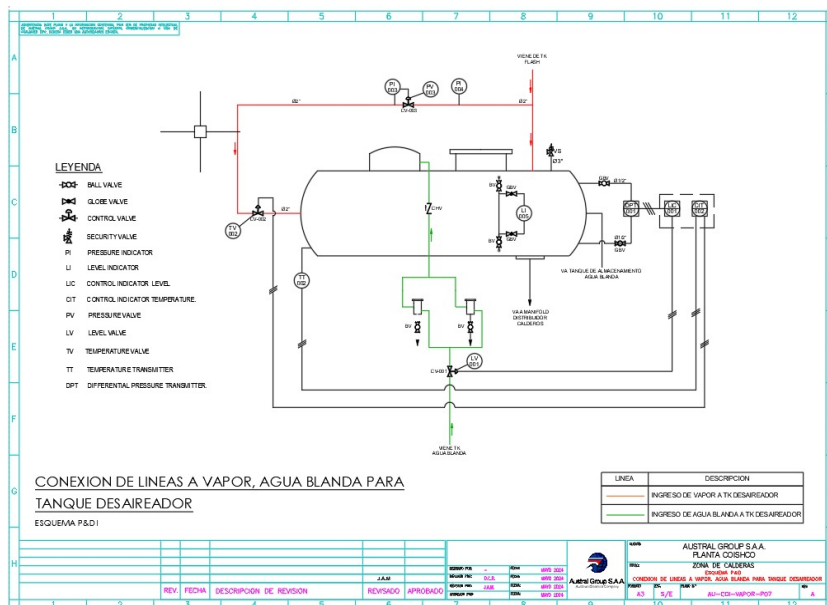

- ESQUEMA DE PRINCIPIO - TANQUE DESAIREADOR ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS

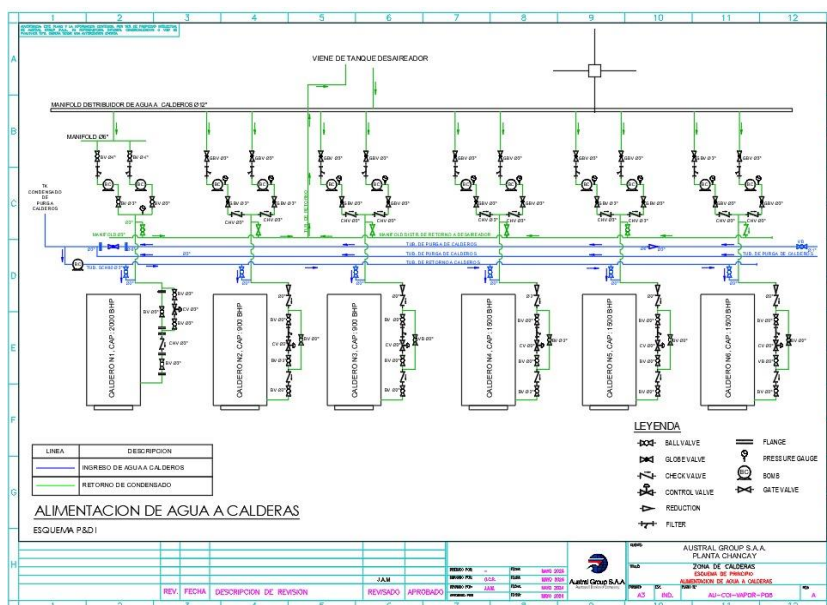

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN
DE PLANOS DE REDES DE VAPOR

PLANTA AUSTRAL – COISHCO

AUSTRAL GROUP S.A.A
COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ

Proveedor: IC AMPER


Cliente: AUSTRAL GROUP

Rev. 01


Fecha: 18/05/24



- P&ID - TANQUE DESAIREADOR ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS Y SALIDA DE PURGAS CONDENSADO

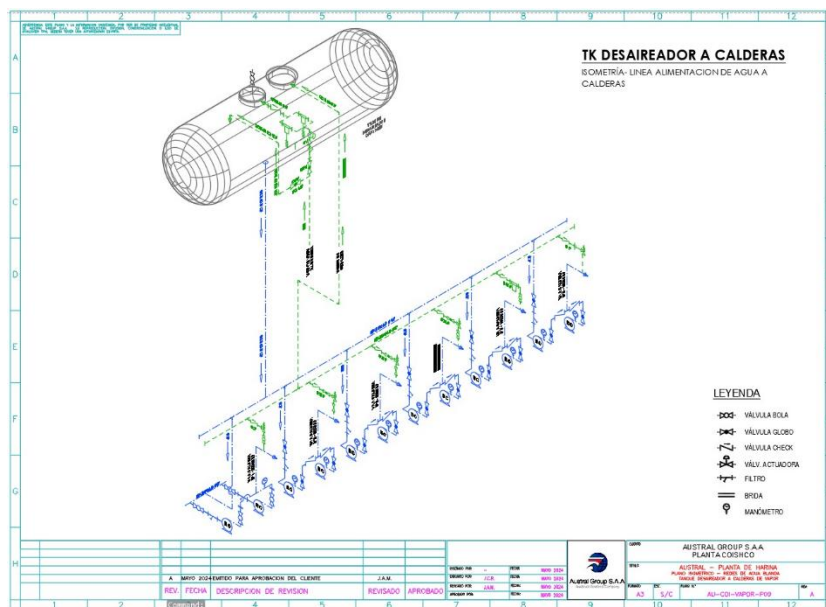

- ESQUEMA DE PRINCIPIO - CONEXIÓN LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR N°4, N°5 Y N°6 (1500 BHP) HASTA MANIFOLD N°1 EN SALA DE CALDERAS

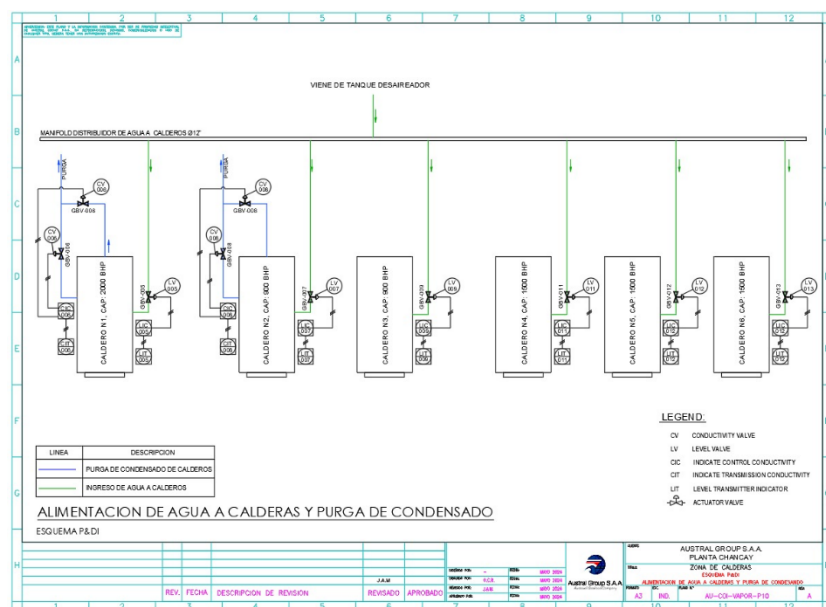

INFORME LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN
DE PLANOS DE REDES DE VAPOR

PLANTA AUSTRAL – COISHCO

AUSTRAL GROUP S.A.A
COISHCO – SANTA – ANCASH – PERÚ

Proveedor: IC AMPER

Cliente: AUSTRAL GROUP

Rev. 01

Fecha: 18/05/24



- ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TK FLASH N°1 (ZONA CALDEROS)

