


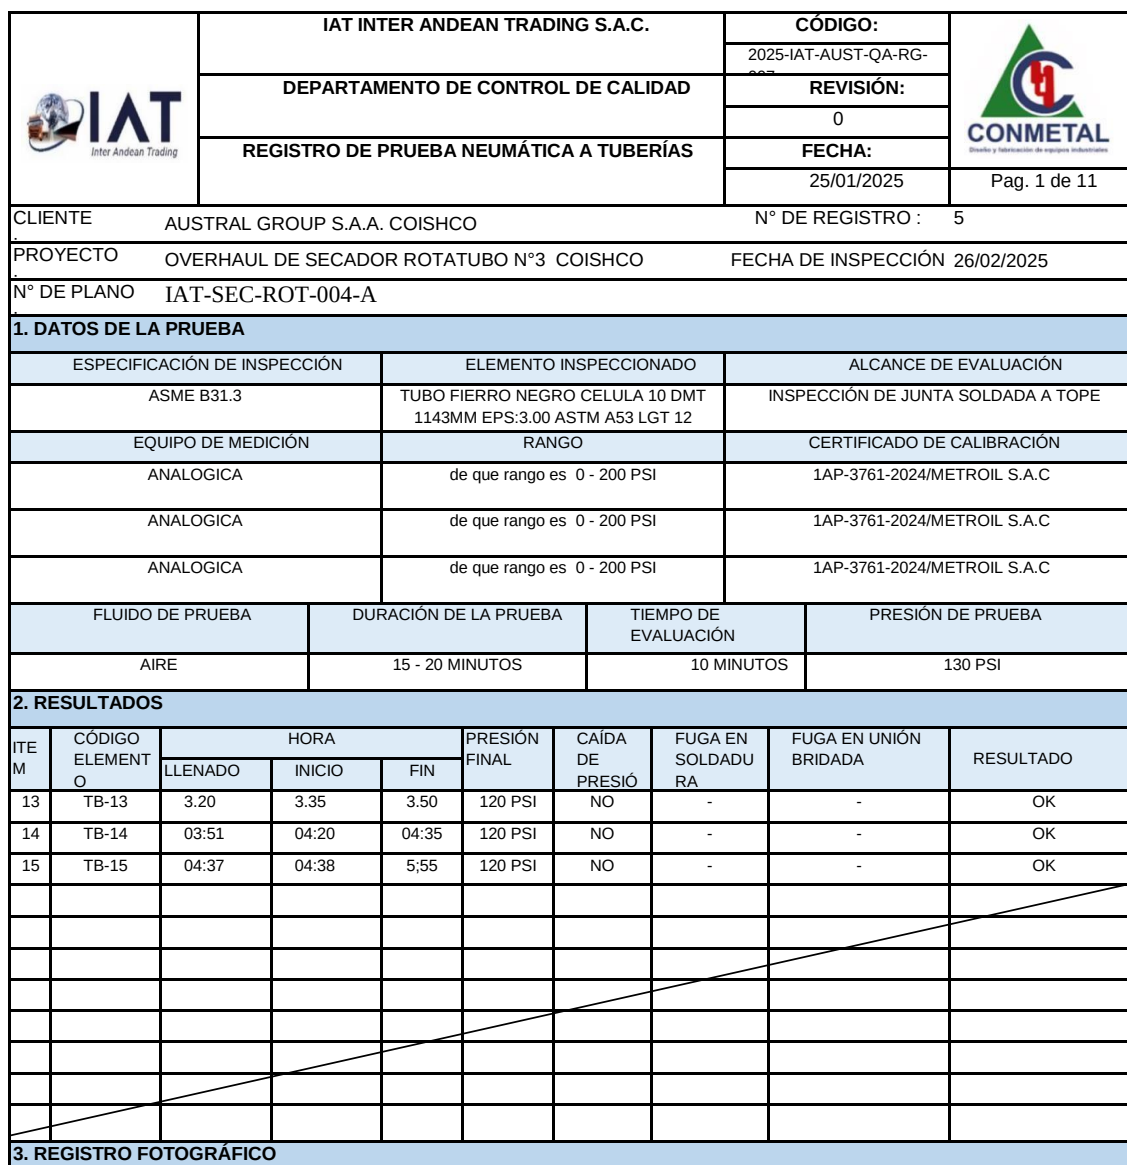

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

[illegible]

varillon de 18 mtr N° 31

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-003		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		25/01/2025		Pag. 1 de 10	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	26/02/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASTM-192	TUBO ACERO CEDULA:N/A,ESPESOR:3.60MM	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-32	9.30	9.45	10.05	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-33	9.50	10.08	10.30	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-34	10.10	10.35	10.55	120 PSI	NO	-	-	OK
4	TB-35	10.45	11.00	11.20	120 PSI	NO			OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Varillos de 18mt N°-32	 Varillon de 18mt N°-33	 Varillon de 18mt N°-34	 varillon de 198nt N°35
---	---	--	---

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
			FECHA: 25/01/2025		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS				

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO : 2
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN 27/02/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A	

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASTM-192	TUBO ACERO CEDULA:N/A,ESPESOR:3.60MM	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS
		130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	36	11.10	11.30	11.50	120 PSI	NO	-	-	OK
2	37	11.40	11.55	12.15	120 PSI	NO	-	-	OK
3	38	12.00	12.18	12.40	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Varillos de 18mt N°-36



varillon de 18mt N°37



Varillon de 18mt N°-38

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

