










	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002			
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0			
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025			
Pag. 1de 5						
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-801 FECHA DE CONTROL 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002						
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=250 90° CANT=05		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=2910 CANT=01 135°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=250 90° CANT= 05		
						
RESULTADOS						
Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
				c		
			Plano	250	M CAL	AC/RE
1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	251	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	252	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	250	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	252	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	250	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
RESULTADOS						
Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
				d		
			Plano	2910	M CAL	AC/RE
1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2911	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	1		
RESULTADOS						
Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
				e		
			Plano	250	M CAL	AC/RE
1	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	251	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	1		
2	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	252	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	2		
3	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	251	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	1		
4	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	252	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	2		
5	2/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	250	MC-01	A-C
			$\Delta \pm$	0		
3. COMENTARIOS						
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente				

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																																																													
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0																																																																																																																																																													
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025																																																																																																																																																													
Pag. 1de 5																																																																																																																																																																
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80I FECHA DE CONTROL 3/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																																																																
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=3260 135° CANT=03		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36-1970 90° CANT=01		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=920 90° CANT=01																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>f</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>3260</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3261</td> <td>MC-01</td> <td>A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3262</td> <td>MC-01</td> <td>A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>3260</td> <td>MC-01</td> <td>A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>1970</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>1971</td> <td>MC-01</td> <td>A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>920</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>921</td> <td>MC-01</td> <td>A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		f				Plano	3260	M CAL	AC/RE	1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3261	MC-01	A- C				Δ ±	1			2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3262	MC-01	A- C				Δ ±	2			3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3260	MC-01	A- C				Δ ±	0			RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		g				Plano	1970	M CAL	AC/RE	1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1971	MC-01	A- C				Δ ±	1			RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		H				Plano	920	M CAL	AC/RE	1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	921	MC-01	A- C				Δ ±	1																														
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																										
Item	Fecha	Codigo		f																																																																																																																																																												
			Plano	3260	M CAL	AC/RE																																																																																																																																																										
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3261	MC-01	A- C																																																																																																																																																										
			Δ ±	1																																																																																																																																																												
2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3262	MC-01	A- C																																																																																																																																																										
			Δ ±	2																																																																																																																																																												
3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3260	MC-01	A- C																																																																																																																																																										
			Δ ±	0																																																																																																																																																												
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																										
Item	Fecha	Codigo		g																																																																																																																																																												
			Plano	1970	M CAL	AC/RE																																																																																																																																																										
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1971	MC-01	A- C																																																																																																																																																										
			Δ ±	1																																																																																																																																																												
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																										
Item	Fecha	Codigo		H																																																																																																																																																												
			Plano	920	M CAL	AC/RE																																																																																																																																																										
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	921	MC-01	A- C																																																																																																																																																										
			Δ ±	1																																																																																																																																																												
3. COMENTARIOS																																																																																																																																																																
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE																																																																																																																																																												
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente																																																																																																																																																														

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0																																																																																																								
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025																																																																																																								
Pag. 1de 5																																																																																																										
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. CÓD. DE REGISTRO RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80I FECHA DE CONTROL 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																										
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=2420 CANT=07 ANGL=90°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=190 CANT=05 ANGL=90°																																																																																																								
																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>2420</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2421</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2422</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2420</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2421</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2422</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2420</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2420</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		I				Plano	2420	M CAL	AC/RE	1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2421	MC-01	A- C				Δ ±	1	2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2422	MC-01	A- C				Δ ±	2	3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C				Δ ±	0	4	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2421	MC-01	A- C				Δ ±	1	5	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2422	MC-01	A- C				Δ ±	2	6	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C				Δ ±	0	7	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C				Δ ±	0
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																				
Item	Fecha	Codigo		I																																																																																																						
			Plano	2420	M CAL	AC/RE																																																																																																				
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2421	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																						
2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2422	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																						
3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	0																																																																																																						
4	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2421	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																						
5	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2422	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																						
6	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	0																																																																																																						
7	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2420	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	0																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>J</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>190</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>191</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		J				Plano	190	M CAL	AC/RE	1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	191	MC-01	A- C				Δ ±	1																																																																								
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																				
Item	Fecha	Codigo		J																																																																																																						
			Plano	190	M CAL	AC/RE																																																																																																				
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	191	MC-01	A- C																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																						
3. COMENTARIOS																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">CALIDAD IAT</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">PRODUCCIÓN IAT</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">SUPERVISOR CLIENTE</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">CLIENTE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad </td> <td style="text-align: center;">  DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE	 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																																																																																	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE																																																																																																							
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																																																																																									

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002			
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0			
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025			
Pag. 1de 5						
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. de Registro RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80I Fecha de Control 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A Procedimiento 2025-IAT-AUT-QA-PR-002						
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=2240 CANT=05 ANGL=90°			PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=1970 CANT=05 ANGL=90°			
						
RESULTADOS						
Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
				K		
			Plano	2240	M CAL	AC/RE
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2241	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2242	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2240	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
4	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2241	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
5	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2242	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
RESULTADOS						
Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
				L		
			Plano	190	M CAL	AC/RE
1	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	191	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
2	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	192	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
3	3/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	190	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
3. COMENTARIOS						
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente				

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 1 de 5			

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL	1/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B




DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR B


CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO	RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL	1/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES


METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA	NATURAL	AMBOS LADOS	R	G	GIN	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA		ASTM-A36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313	


2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

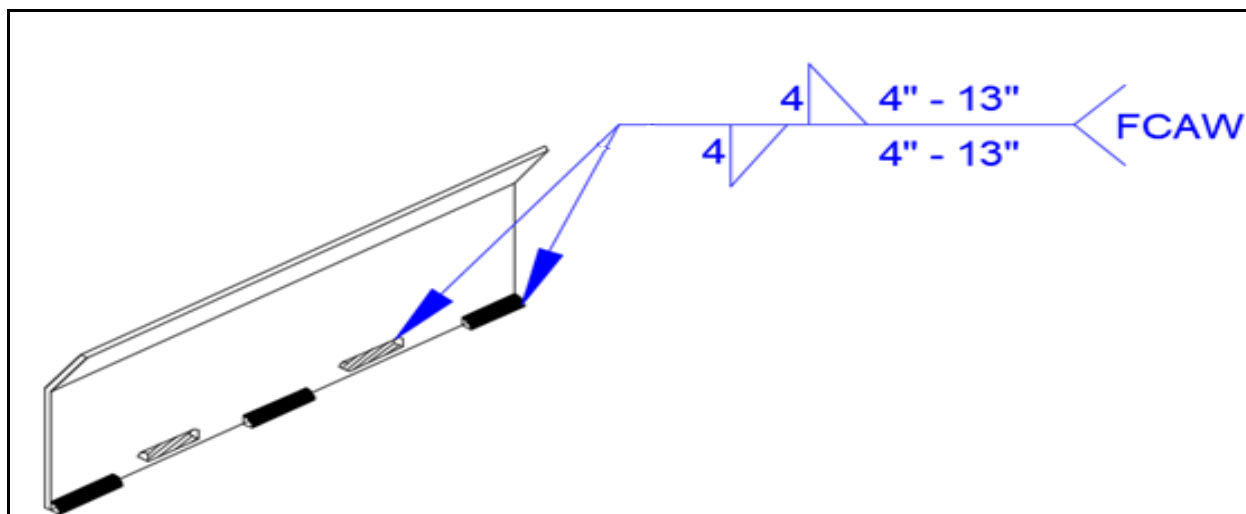

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SCB	J-1	JT	2010	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025		
2		J-2	JT	2010	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	2010	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	2010	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	2010	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

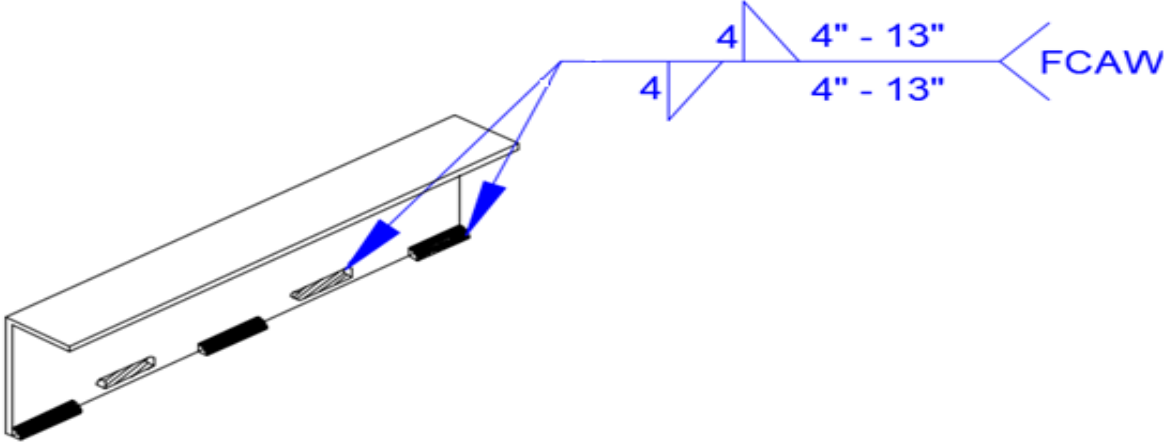
	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005																																																																																																																								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0																																																																																																																								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025																																																																																																																								
Pag 1 de 2																																																																																																																											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80I FECHA DE CONTROL 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																											
CARACTERISTICAS GENERALES																																																																																																																											
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES																																																																																																																							
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH																																																																																																																							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN																																																																																																																						
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313																																																																																																																						
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA																																																																																																																											
																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">COMPONENTE</th> <th rowspan="2">JUNTA N°</th> <th rowspan="2">TIPO DE JUNTA</th> <th rowspan="2">LONGITUD (mm)</th> <th rowspan="2">CÓDIGO SOLDADOR</th> <th rowspan="2">PROCESO</th> <th colspan="2">CATETO</th> <th rowspan="2">FECHA</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">califica</th> </tr> <tr> <th>MINIMO</th> <th>MAXIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="5">PTT-ASTM-36-SC B</td> <td>J-1</td> <td>JT</td> <td>300</td> <td>JLV</td> <td>FCAW</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>1/03/2025</td> <td>OK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>J-2</td> <td>JT</td> <td>300</td> <td>JLV</td> <td>FCAW</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>1/03/2025</td> <td>OK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J-3</td> <td>JT</td> <td>300</td> <td>JLV</td> <td>FCAW</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>1/03/2025</td> <td>OK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>J-4</td> <td>JT</td> <td>300</td> <td>JLV</td> <td>FCAW</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>1/03/2025</td> <td>OK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>J-5</td> <td>JT</td> <td>300</td> <td>JLV</td> <td>FCAW</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>1/03/2025</td> <td>OK</td> <td>-</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica	MINIMO	MAXIMO	1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-	2	J-2	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-	3	J-3	JT	300	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-	4	J-4	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-	5	J-5	JT	300	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-																																																
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR								PROCESO	CATETO				FECHA	C	califica																																																																																																							
						MINIMO	MAXIMO																																																																																																																				
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-																																																																																																																
2		J-2	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-																																																																																																																
3		J-3	JT	300	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-																																																																																																																
4		J-4	JT	300	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-																																																																																																																
5		J-5	JT	300	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-																																																																																																																
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE																																																																																																																					
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente																																																																																																																									

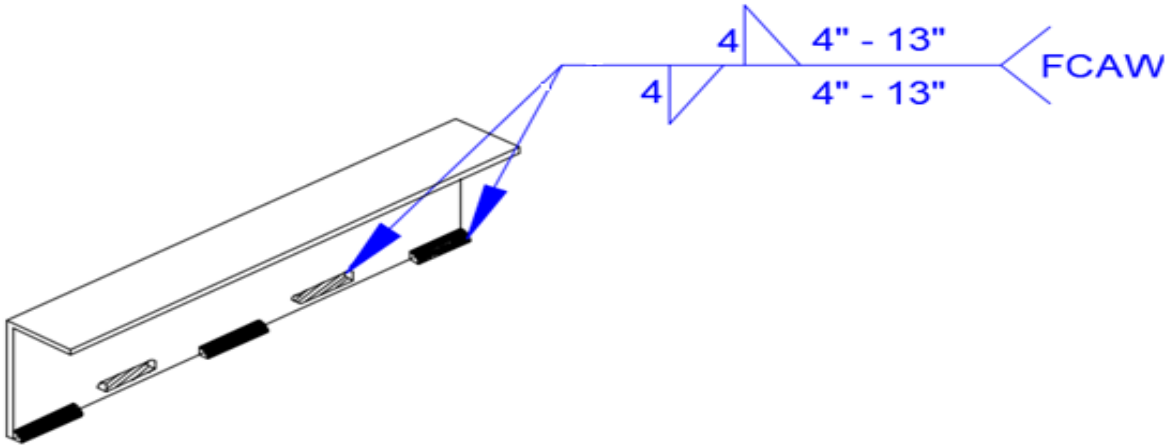	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
Pag 1 de 2											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80 FECHA DE CONTROL 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002											
CARACTERISTICAS GENERALES											
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILARES							
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	☐ G ☐ R ☐ GCH ☐							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN						
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313						
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO		M CALD	AC/RE
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
2		J-2	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	250	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	250	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025		
Pag 1 de 2					
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO		RG01-01	
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80		FECHA DE CONTROL		1/03/2025	
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO		2025-IAT-AUT-QA-PR-002	


CARACTERISTICAS GENERALES					
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

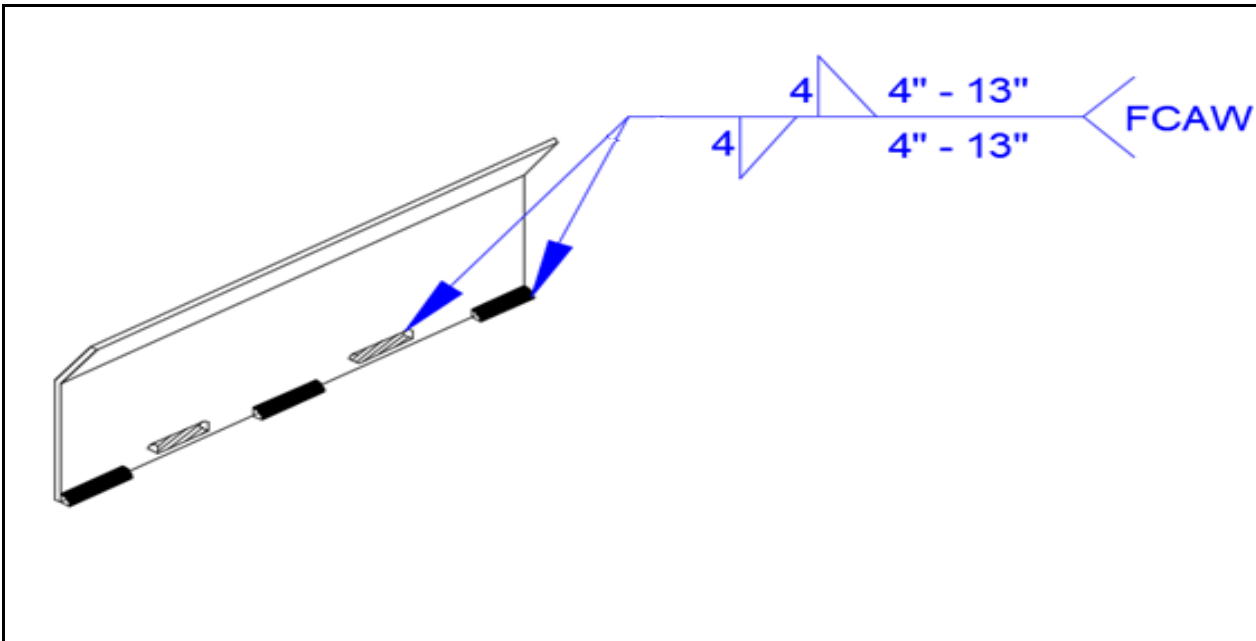

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C M CALD	califica AC/RE
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-B	J-1	JT	2910	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

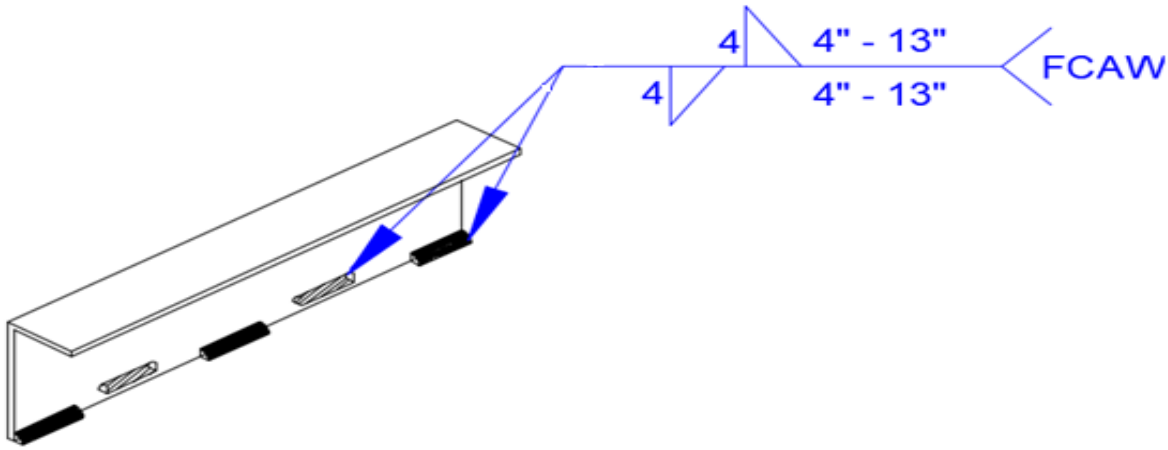	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
Pag 1 de 2											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. DE REGISTRO RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80 FECHA DE CONTROL 1/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002											
CARACTERISTICAS GENERALES											
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES							
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN						
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-B	3//16	ASME B313						
2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C	califica
							MINIMO	MAXIMO		M CALD	AC/RE
1	PTT-ASTM-36-SC B	J-1	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
2		J-2	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
3		J-3	JT	250	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
4		J-4	JT	250	JLV	FCAW	4	5	1/03/2025	OK	-
5		J-5	JT	250	JLV	FCAW	4	6	1/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente								
