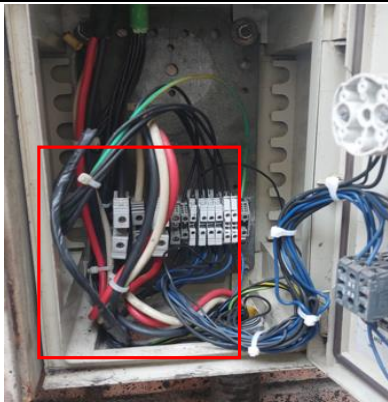
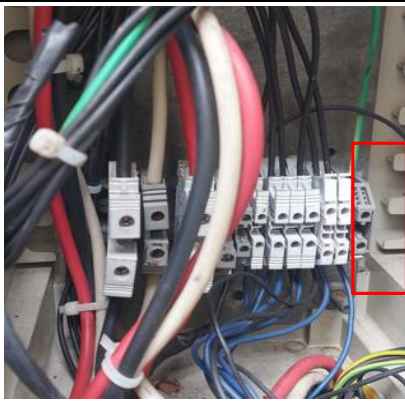


	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company
	ÁREA DE INSPECCIÓN: ZONA DE TANQUES BUNKER R500		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 19-09-22	
	ÁREA: BOMBAS BUNKER R500	NÚMERO DE HALLAZGO: 14	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO PRESENTA CABLES DESORDENADOS QUE SALEN DEL TABLERO	Se requiere ordenar los cables del tablero, agruparlos por circuito y sujetarlos con cintillo para mayor orden al momento de abrir tablero	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
2	TABLERO NO PRESENTA BORNES O BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
3	TABLERO PRESENTA DEMASIADA SUCIEDAD EN SU SUPERFICIE	Se requiere realizar la limpieza del tablero debido a que presenta grasa en su superficie	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
4	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere rotular el tablero con indicando su nombre y nivel de tensión en su parte frontal	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
5	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO	Se requiere rotular el tablero con señalización de riesgo o peligro eléctrico en la parte frontal del tablero en una zona muy cercana del tableros	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
6	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere realizar la instalación del cable de tierra de alimentación, este cable debe conectarse a los bornes de tierra a instalar deben ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-1
7	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
8	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA SUELTO SIN CONEXIÓN	Se requiere conectar el cable de tierra a la barra de tierra a instalar	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
9	TABLERO PRESENTA CABLES SUELTOS	Se requiere agrupar los cables sueltos y aislarlos de manera correcta y sujetarlos con cintillo para mayor orden dentro del tablero	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
10	TABLERO PRESENTA COMPONENTES SIN CONEXIONADO	Se requiere realizar las conexiones dentro del tablero con componentes existentes, de lo contrario poner en reserva los equipos	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
11	TABLERO PRESENTA DEMASIADA SUCIEDAD EN SU SUPERFICIE	Se requiere realizar la limpieza del tablero debido a que presenta grasa en su superficie	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
12	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere rotular el tablero con indicando su nombre y nivel de tensión en su parte frontal	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
13	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO	Se requiere rotular el tablero con señalización de riesgo o peligro eléctrico en la parte frontal del tablero en una zona muy cercana del tableros	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2
14	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación de un cable de tierra de alimentación desde el tablero mas cercano	Tablero de Mando de Bombas Bunker R500 T-BR500-2



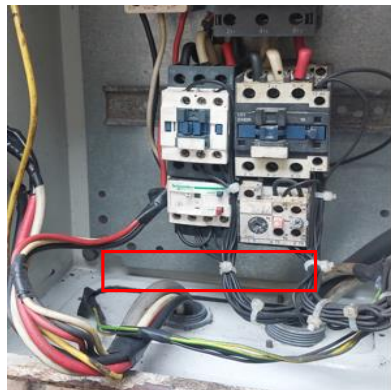
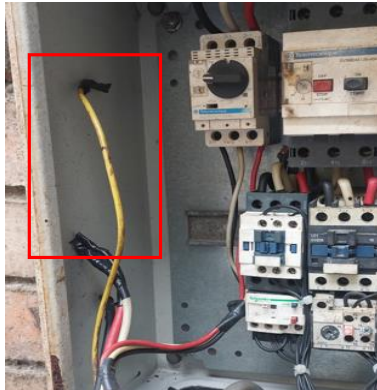
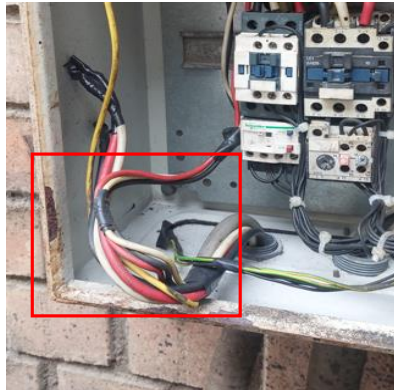
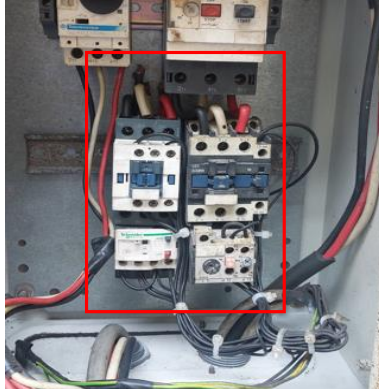
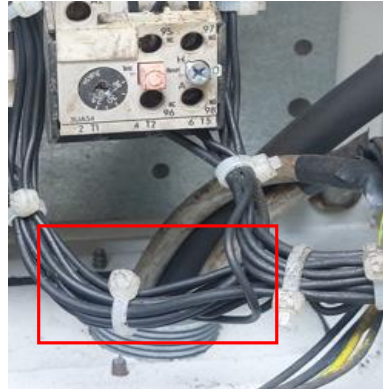




Ítem 1

Ítem 2,6

Ítem 3,4,5

			
Ítem 7	Ítem 8	Ítem 9	
			
Ítem 10	Ítem 11,12,13	Ítem 14	
Elaborado por:	Ronald Cama		Departamento de Ingeniería
Revisado por:	Ing. Jorge Álvarez		
