


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 1 de 2


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-13
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 21/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_005_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA A TOPE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-D-01	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
2		J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
3	COD. TB-D-02	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
4		J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
5	COD. TB-D-03	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
6		J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
7	COD. TB-D-04	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
8		J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
9	COD. TB-D-05	J3	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
10		J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
11	COD. TB-D-06	J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
12		J3	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-D-06	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
14		J2	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
15		J3	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	


5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme


6. NOTA

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO D
TB. 4 1/2" x 3 x 20000
COD. TB-D-01 - COD. TB-D-03
CANT. 3 UND



GRUPO D
TB. 4 1/2" x 3 x 20000
COD. TB-D-04 - COD. TB-D-06
CANT. 3 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 1 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-20
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 20/03/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. ESPJ-PT.ESPJ-01	J1	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
2	COD. ESPJ-PT.ESPJ-02	J2	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
3	COD. ESPJ-PT.ESPJ-03	J3	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
4	COD. ESPJ-PT.ESPJ-04	J4	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
5	COD. ESPJ-PT.ESPJ-05	J5	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-
6	COD. ESPJ-PT.ESPJ-06	J6	FILETE	3490	IP-SI	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 2 de 2

6. NOTA

Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESPEJO - PORTA ESPEJOS
PL. 31.75 MM
COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 - COD. ESPJ-PT.ESPJ-06
CANT. 06 UND

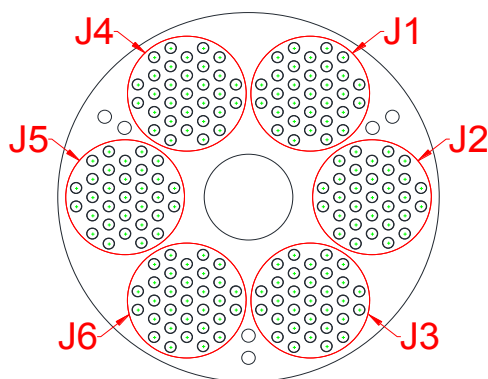


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : CASC D CHQT INTRNO	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ .		
ESPEJOR MATERIAL : 3//8	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM A-36	COD. INSPECCIÓN : CHQT D CSC D RT TB 003		

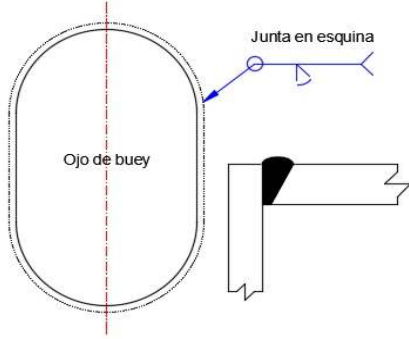2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : BONBONA		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
2	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
3	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
4	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
5	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
6	CHQT D CSC D RT TB 003	EN ESQUINA	1500	ip-si	-	-	-	CONFORME	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISIÓN CLIENTE			CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente						

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BB LADO DESCARGA



PT- EN BB LADO DESCARGA



PT- EN BB LADO DESCARGA



PT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT EN CASCO DE CAHAQUETA 2.1



PT EN CASCO DE CAHAQUETA 2.1



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PTPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 Lourdes Amando Ramos		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PTPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT EN CASCO DE CHAQUETA 4.1



PT EN CASCO DE CHAQUETA 4.1



PPT- EN BB LADO DESCARGA



PTPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 Inspectores de Producción		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	

6. COMENTARIOS
SE VISUALISA OBSERVACIONES REDONDEADAS AGRUPADAS EN CASCO CHAQUETA 04
EN PARTE INFERIOR LADO DERECHO
COMO EN LA PARTE INFERIOR TAL COMO SE APRESIA EN LAS FOTOGRAFIAS
SE PROSEDERA A SU REPARACION ATODAS LAS OBSERBASIONES

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
PPT- EN BB LADO DESCARGA	PTPT- EN BB LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		
