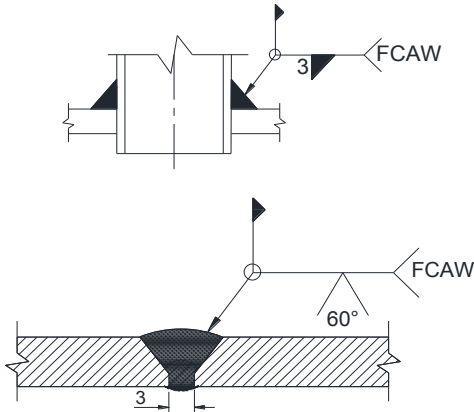


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-22
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 3/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: ESPEJO - TP.BOMBEADA LADO CARGA	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 mm	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A-36	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. BC-TB-01	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
2		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
3		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
4		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
5		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
6	COD. BC-TB-02	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
7		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
8		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
9		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
10		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
11	COD. BC-TB-03	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
12		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
13		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
14		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
15		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

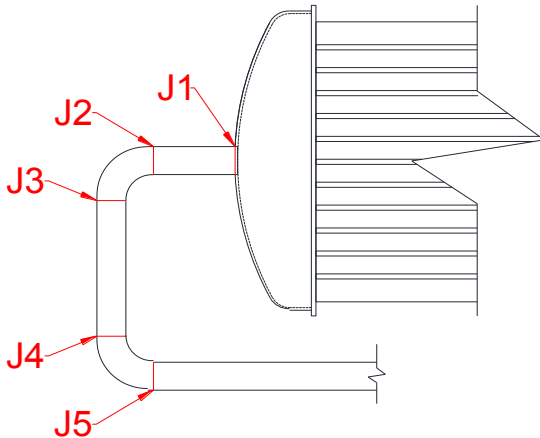
	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
16	COD. BC-TB-04	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
17		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
18		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
19		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
20		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
21	COD. BC-TB-05	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
22		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
23		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
24		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
25		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
26	COD. BC-TB-06	J1	FILETE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
27		J2	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
28		J3	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
29		J4	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-
30		J5	A TOPE	360	IP-BM	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
TUBERIA LADO CARGA TB. 4 1/2" x 3 mm COD. BC-TB-01 - COD. BC-TB-06 CANT. 06 UND 

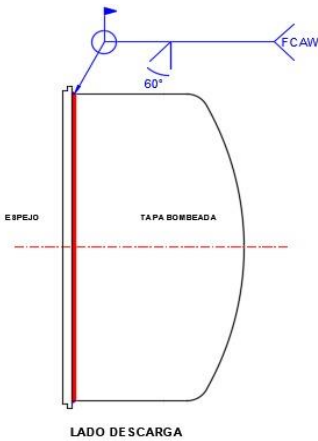
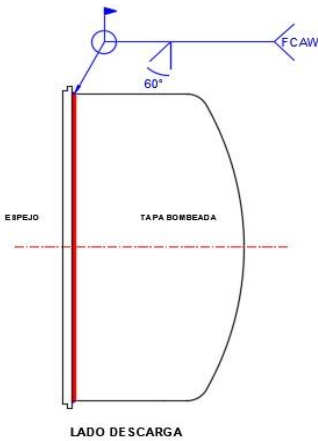
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Diseño y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 025-IAT-AST-QA-RG-00						
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0						
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES		FECHA: 25/01/2025						
Pag. 1 de 3									
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 F. DE CONTROL : 5/04/2025						
1. DATOS DE LA INSPECCIÓN									
ELEMENTO / CONJUNTO : BB PRT DSCG			RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ						
ESPESOR MATERIAL : 9.5			PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL						
MATERIAL BASE : ASTM A-53			COD. INSPECCIÓN : BB PRT DSCG						
2. DATOS DE LA PRUEBA									
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.									
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW									
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO									
ZONA EVALUADA : BRD D BB									
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN									
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL									
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA									
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO									
APLICACIÓN : ESPRAY									
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00									
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00									
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00									
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS									
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS									
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS									
4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
2	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
3	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
4	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
5	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
6	BB PRT DSCG	J-T	1070	G-F	-	-	-	CONFORME	-
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISIÓN CLIENTE		CLIENTE			
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente							

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 025-IAT-AST-QA-RG-00	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	:	Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	:	Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	:	Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	:	Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



BB PARTE DESCARGA



PT-BB PARTE DESCARGA



PT-BB PARTE DESCARGA



PT-BB PARTE DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 025-IAT-AST-QA-RG-00	 Pag. 3 de 3
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	: Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	: Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	: Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	: Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PT-BB PARTE DESCARGA	 PT-BB PARTE DESCARGA
 PT-BB PARTE DESCARGA	 PT-BB PARTE DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

REGISTROS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN	FECHA: 26/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 25/01/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-0003	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUST-QA-PR-001

Item	Descripción	Cant.	Un.	Proveedor	Guía de remisión	Certificado de calidad	Colada / Lote / N° Producción	Inspección		Fecha de Inspección	Observaciones
								Ok	Obs.		
1	TUBO HIERRO NEGRO CEDULA 10,DIAMETRO (mm)114,3 longitud(m)12,espesor(mm)	130	UN..	AUSTRAL S.A.A	N° T001-00000429	5816516	194847	☒	☐	27.01.205	-
2	tubo HIERRO NEGRO CEDULA 10,DIAMETRO (mm)114,3 longitud(m)12,espesor(mm)	412	UN..	AUSTRAL S.A.A	N° 20610398503	5816516	194848	☒	☐	27.01.205	-
3	TUBO ACERO ASTM A-192 4.1/2 114 30MMX9MMTSBRA SEGÚN G/RFEBERHARDT S.A.N T001-000651	96	UN..	AUSTRAL S.A.A	VPE2- 026331	-	196676	☒	☐	01.02.2025	-
4	PLANCHA ESTRUC A-36 9.0MMX1500MMX300MM	15	UN..	AUSTRAL S.A.A	N° EG07-00001011	B02407020018	24AD3779	☒	☐	31.01.2025	-
5	PLANCHA ESTRUC A-36 12MMX1500MMX6000MM	2	UN..	AC ARPA	N° EG07-00001011	112-0010647-517	-	☒	☐	31.01.2025	-
6	PLANCHA ESTRUC A-36 32.0MMX2400MM1200MM	6	UN..	AC ARPA	N° EG07-00001011	2.40622E+11	24305241C	☒	☐	31.01.2025	-
7	PLANCHA ESTRUC A-36 9.0MMX1500MM6000MM	4	UN..	AC ARPA	N° EG07-00001011	112-0010647-517	24A03779	☒	☐	31.01.2025	-
8	PLANCHA ESTRUC A-36 4.5MMX1500MM3000MM	16	UN..	AC ARPA	N° EG07-00001011	G-OFE65-0682108	-	☒	☐	31.01.2025	-

COMENTARIOS	CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
	 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.							CÓDIGO: 2024-IAT-HDK-QA-RG-001											
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD							REVISIÓN: 0											
	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN							FECHA: 25/07/2024											
Pag. 1 de 1																			
CLIENTE : PROYECTO : N° PLANO : -										CÓD. DE REGISTRO : RG01-02 FECHA DE CONTROL : 4/08/2024 PROCEDIMIENTO : 2024-IAT-HDK-QA-PR-001									
Item	Descripción	Cant.	Un.	Proveedor	Guía de remisión	Certificado de calidad	Colada / Lote /N° Producción	Inspección Ok Obs.		Fecha de Inspección	Observaciones								
9	PLANCHA ACERO INOX A-240 C-304 L 3.0MMX1500X300 2B-PVC	9	UN	INAMESA	N° EG07- 00001011	EN102043.1	A043456	☒	☐	31/02/2025	-								
10	PLANCHA DE 3/8"X1200MMX2400MM ASTM A 36	3	UN	INAMESA	N° EG07- 00001011	C02408130625	24CD4796	☒	☐	31/02/2025									
11	FIERROS/16	1	UN	INAMESA	N° EG07- 00001011	240608-377	GE101	☒	☐	3/02/2025	-								
12	PLACHA DE 1/4"X1500MMX300MM ASTM A 36	2	UN	INAMESA	N° EG07- 00001011	24305241C	-	☒	☐	8/02/2025	-								
13	TUVO RECUPERADOS DE ASUSTRAL 3M	90	UN	AUSTRAL S.A.A	-	-	-	☒	☐	8/02/2025	-								
14	TUBOS 3"CELULA 40 ASTM A-53	1	UN	-	-	-	-	☒	☐	6/02/2025	-								
15	BRIDAS DE 3" SLIPON	15	UN	-	-	-	-	☒	☐	23/03/2025	-								
16	BRIDASA ASTM.A36 1/4	6	UN	AC ARPA	N° EG07- 00001011	2.40622E+11	24305241C	☒	☐	19/03/2025	-								
17	BRIDAS ASTM A-36-2"	6	UN	-	-	-	-	☒	☐	23/03/2025	-								
COMENTARIOS				CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE									
																			
				LOURDES AMANDO RAMOS		DAVID MEZA ATAÚ													
				Inspectora de Control de Calidad		Ingeniero Residente													

