

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		REVISIÓN:		
			0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	8/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA			
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE SUMERSIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS									
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-190	12.40	1.00	1.20	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Varillos de 18mt N°-	

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-003		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		REVISIÓN:		
			0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 1	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	8/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE SUMERSIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS


ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-191	1.20	1.40	2.00	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-192	2.05	2.20	2.40	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

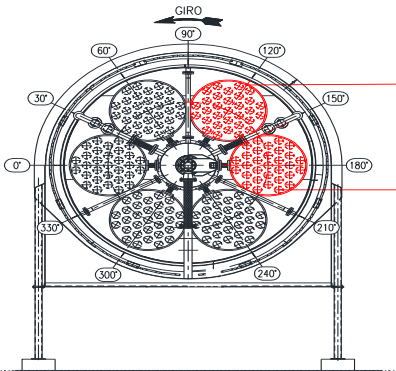
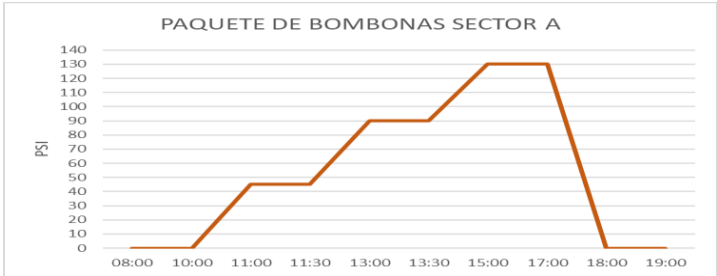



Varillos de 18mt N°-

Varillon de 18mt N°-192

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

REGISTROS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:			
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008			
		REVISIÓN:			
		0			
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA	FECHA:	25/01/2025		Pag. 1 de 3	
CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008		
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	6/04/2025		
N° PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008		
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ELEMENTO / COMPONENTE	NORMA DE EJECUCIÓN			
VISUAL	BOMBONA DE SECADOR (ST A-2 BB)	ASME SEC. VIII			
TIPO DE MATERIAL BASE	ESPESOR NOMINAL	ELEMENTO DE INSPECCIÓN			
ASTM A36 - ASTM A192	9.5 MM	SOLDADURA DE VARILLONES Y BOMBONA			
2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
MANÓMETRO	MARCA	RANGO			
MANÓMETRO DE DEFORMACIÓN CON INDICADOR ANALÓGICO	WINTERS	0 - 160 PSI			
FECHA DE CALIBRACIÓN	CERTIFICADO / CÓDIGO	PATRÓN			
30/01/2025	LPQ-0119-2025	(U) 0,08PSI a 0,09psi			
3. REGISTRO DE LA PRUEBA					
TIPO DE PRUEBA		MEDIO DE PRUEBA	PRESIÓN DE PRUEBA		
☒ PRESIÓN HERMETICIDAD ☐		AGUA BLANDA	130 PSI		
FECHA	HOR A	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA	TIEMPO DE RESIDENCIA	OBSERVACIONES
6/04/2025	8:00-AM	INICIO DE LLENADO	-	-	
	9:00-AM	1ER-PRUEBA PREVIA	45 psi	2 h	Tiempo de prueba: 2h
	9:30-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	12:00-AM	2DA-PRUEBA PREVIA	90 psi	2h	Tiempo de prueba: 2h
	12:05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	2:00-AM	3RAPREVIA PREVIA	130		
	2:05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	-	
4. ESQUEMA / GRÁFICO					
 					
CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente				

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
		REVISIÓN:	
		0	
REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA	FECHA:	25/01/2025	Pag. 2 de 3

CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	6/04/2025
Nº PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008



BOMBA MANUAL



PRIMERA PRUEBA PREVIA 45 PSI



PRIMERA PRUEBA PREVIA 90 PSI



PRIMERA PRUEBA PREVIA 130 PSI



TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES

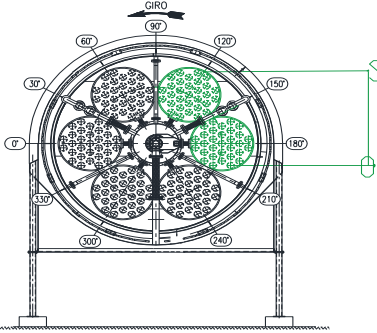
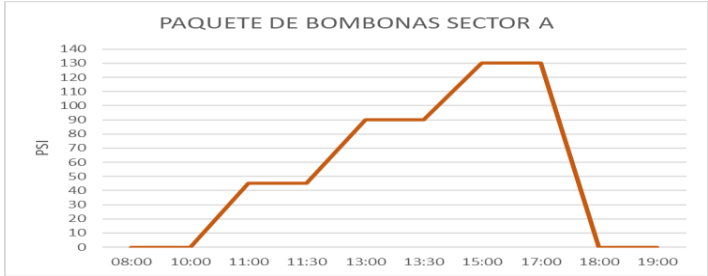



TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:									
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008									
		REVISIÓN:									
		0									
REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA		FECHA:									
		25/01/2025	Pag. 3 de 3								
CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008								
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	6/04/2025								
Nº PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008								
 6 abr. 2025 12:41:10 p. m.  6 abr. 2025 12:42:42 p. m. Coishco Ancash TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES <tr><td colspan="4">  BB-1 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM BONBONA 1 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES BONBONA 2 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES <tr><td colspan="4">  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES </td></tr></td></tr>				 BB-1 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM BONBONA 1 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES BONBONA 2 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES <tr><td colspan="4">  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES </td></tr>				 BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES			
 BB-1 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM BONBONA 1 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES BONBONA 2 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES <tr><td colspan="4">  BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES </td></tr>				 BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES							
 BB-2 ST-A P.HD 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM  TB-2B ST-A 06-04-25 HC-900AM TM-17 AM TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES											

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-008		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA		FECHA: 25/01/2025		
			Pag. 1 de 3		
CLIENTE: AUSTRAL GRUP S.A.A			COD DE REGISTRO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-008		
PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO			FECHA DE CONTROL: 7/04/2025		
N° PLANO: IAT-SEC RT 003			PROCEDIMIENTO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-008		
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ELEMENTO / COMPONENTE		NORMA DE EJECUCIÓN	
VISUAL		BOMBONA DE SECADOR (ST)		ASME SEC. VIII	
TIPO DE MATERIAL BASE		ESPESOR NOMINAL		ELEMENTO DE INSPECCIÓN	
ASTM A36 - ASTM A192		9.5 MM		SOLDADURA DE VARILLONES Y BOMBONA	
2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
MANÓMETRO		MARCA		RANGO	
MANÓMETRO DE DEFORMACIÓN CON INDICADOR ANALÓGICO		WINTERS		0 - 160 PSI	
FECHA DE CALIBRACIÓN		CERTIFICADO / CÓDIGO		PATRÓN	
30/01/2025		LPQ-0119-2025		(U) 0,08PSI a 0,09psi	
3. REGISTRO DE LA PRUEBA					
TIPO DE PRUEBA		MEDIO DE PRUEBA		PRESIÓN DE PRUEBA	
☒ PRESIÓN ☐ HERMETICIDAD		AGUA BLANDA		130 PSI	
FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA	TIEMPO DE RESIDENCIA	OBSERVACIONES
7/04/2025	8:00-AM	INICIO DE LLENADO	-	-	
	9:00-AM	1ER-PRUEBA PREVIA	45 psi	2 h	Tiempo de prueba: 2h
	9:30-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	12:00-AM	2DA-PRUEBA PREVIA	90 psi	2h	Tiempo de prueba: 2h
	12.05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	2:00-AM	3RAPREVIA PREVIA	130		
	2.05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	-	
4. ESQUEMA / GRÁFICO					
					
CALIDAD - IAT		PROYECTOS - IAT		SUPERVISOR CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente			

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
	REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN:	
	FECHA:		
		25/01/2025	Pag. 2 de 3
CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	7/04/2025
N° PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
 BOMBA MANUAL  TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES  PRIMERA PRUEBA PREVIA 90 PSI  PRUEBA DE FUGA SECTOR B  PRIMERA PRUEBA PREVIA 130 PSI  TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES			
CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
	REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN:	
	FECHA:		
		25/01/2025	Pag. 3 de 3

CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	6/04/2025
N° PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008



TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES



TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES



BONBONA 1 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES



BONBONA 1 PARTE CARGA SIN OBSERVACIONES

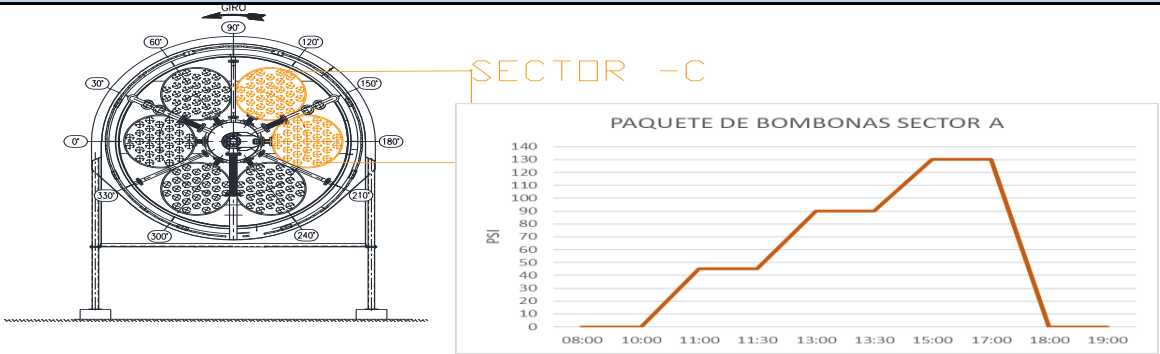


TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES



TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:			
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008			
		REVISIÓN:			
		0			
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA	FECHA:	25/01/2025		Pag. 1 de 3	
CLIENTE: AUSTRAL GRUP S.A.A		COD DE REGISTRO:		2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO		FECHA DE CONTROL		10/04/2025	
N° PLANO: IAT-SEC RT 003		PROCEDIMIENTO		2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ELEMENTO / COMPONENTE	NORMA DE EJECUCIÓN			
VISUAL	BOMBONA DE SECADOR (ST C-355)	ASME SEC. VIII			
TIPO DE MATERIAL BASE	ESPESOR NOMINAL	ELEMENTO DE INSPECCIÓN			
ASTM A36 - ASTM A192	9.5 MM	SOLDADURA DE VARILLONES Y BOMBONA			
2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
MANÓMETRO	MARCA	RANGO			
MANÓMETRO DE DEFORMACIÓN CON INDICADOR ANALOGICO	WINTERS	0 - 160 PSI			
FECHA DE CALIBRACIÓN	CERTIFICADO / CÓDIGO	PATRÓN			
30/01/2025	LPQ-0119-2025	(U) 0,08PSI a 0,09psi			
3. REGISTRO DE LA PRUEBA					
TIPO DE PRUEBA		MEDIO DE PRUEBA		PRESIÓN DE PRUEBA	
☒ PRESIÓN ☐ HERMETICIDAD		AGUA BLANDA		130 PSI	
FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA	TIEMPO DE RESIDENCIA	OBSERVACIONES
10/04/2025	8:00-AM	INICIO DE LLENADO	-	-	
	9:00-AM	1ER-PRUEBA PREVIA	45 psi	2 h	Tiempo de prueba: 2h
	9:30-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	12:00-AM	2DA-PRUEBA PREVIA	90 psi	2h	Tiempo de prueba: 2h
	12:05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	0.25 h	Sin caída de presión
	2:00-AM	3RAPREVIA PREVIA	130		
	2:05-AM	INSPECCIÓN VISUAL	C-F	-	
4. ESQUEMA / GRÁFICO					
					
CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE		
 LOURDES AMADOR RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente				
