




	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		c 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																																																																										
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0																																																																																																																																																																										
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025																																																																																																																																																																										
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80(FECHA DE CONTROL : 26/02/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																																																																													
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=1610 CANT=08 90°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=300 CANT=05 135°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=1610 CANT=08 90°																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">codigo</th> <th rowspan="2">califica</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>Plano</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-7</td> <td>Canpo</td> <td>2911</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-7</td> <td>Canpo</td> <td>2910</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-7</td> <td>Canpo</td> <td>2912</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">codigo</th> <th rowspan="2">califica</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>Plano</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-8</td> <td>Canpo</td> <td>29.11</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-8</td> <td>Canpo</td> <td>29.10</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-8</td> <td>Canpo</td> <td>29.12</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">codigo</th> <th rowspan="2">califica</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>Plano</th> <th>i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-9</td> <td>Canpo</td> <td>2251</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-9</td> <td>Canpo</td> <td>2252</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-9</td> <td>Canpo</td> <td>2250</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-9</td> <td>Canpo</td> <td>2252</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-9</td> <td>Canpo</td> <td>2250</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	Item	Fecha	Codigo	Plano	g	1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2911	MC-01	A- C				Δ ±	1	2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2910	MC-01	A- C				Δ ±	0	3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2912	MC-01	A- C				Δ ±	2	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	Item	Fecha	Codigo	Plano	h	1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.11	MC-01	A- C				Δ ±	1	2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.10	MC-01	A- C				Δ ±	0	2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.12	MC-01	A- C				Δ ±	2	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	Item	Fecha	Codigo	Plano	i	1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2251	MC-01	A- C				Δ ±	1	2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2252	MC-01	A- C				Δ ±	2	3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2250	MC-01	A- C				Δ ±	0	4	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2252	MC-01	A- C				Δ ±	2	5	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2250	MC-01	A- C				Δ ±	0.00
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica																																																																																																																																																																							
Item	Fecha	Codigo	Plano	g																																																																																																																																																																									
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2911	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	1																																																																																																																																																																									
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2910	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	0																																																																																																																																																																									
3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-7	Canpo	2912	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	2																																																																																																																																																																									
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica																																																																																																																																																																							
Item	Fecha	Codigo	Plano	h																																																																																																																																																																									
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.11	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	1																																																																																																																																																																									
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.10	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	0																																																																																																																																																																									
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-8	Canpo	29.12	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	2																																																																																																																																																																									
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica																																																																																																																																																																							
Item	Fecha	Codigo	Plano	i																																																																																																																																																																									
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2251	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	1																																																																																																																																																																									
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2252	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	2																																																																																																																																																																									
3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2250	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	0																																																																																																																																																																									
4	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2252	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	2																																																																																																																																																																									
5	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-9	Canpo	2250	MC-01	A- C																																																																																																																																																																							
			Δ ±	0.00																																																																																																																																																																									
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE																																																																																																																																																																							
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																																																																																																																																																											

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	c 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
Pag. 1de 5			

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-05
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80C	FECHA DE CONTROL	: 26/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=300
 CANT=05 135°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36=1610
 CANT=08 90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=300
 CANT=05 135°

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		j		
			Plano	2670	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-10	Canpo	2671	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-10	Canpo	2672	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		
3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-10	Canpo	2670	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		





RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		k		
			Plano	2240	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-11	Canpo	2242	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		l		
			Plano	3160	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-12	Canpo	3161	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-12	Canpo	3160	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-12	Canpo	3161	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	1		
4	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-12	Canpo	3160	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	0		
5	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-12	Canpo	3162	MC-01	A- C
			$\Delta \pm$	2		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	C 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-05
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80	FECHA DE CONTROL	: 26/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=1610 CANT=08 90°	PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=300 CANT=05 135°	PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=1610 CANT=08 90°	PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=300 CANT=05 135°
			

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo				
			Plano	1970	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-13	Canpo	1971	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo				
			Plano	570	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-14	Canpo	571	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
2	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-14	Canpo	572	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
3	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-14	Canpo	570	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
4	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-14	Canpo	571	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
5	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-14	Canpo	572	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo				
			Plano	190	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-15	Canpo	191	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo				
			Plano	920	M.Cald	AC/RE
1	26/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-16	Canpo	922	MC-01	A- C
			Δ ±	2		

3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 26/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION					INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS		R	G	GIN
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
PALETA	ASTM-A36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313		

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

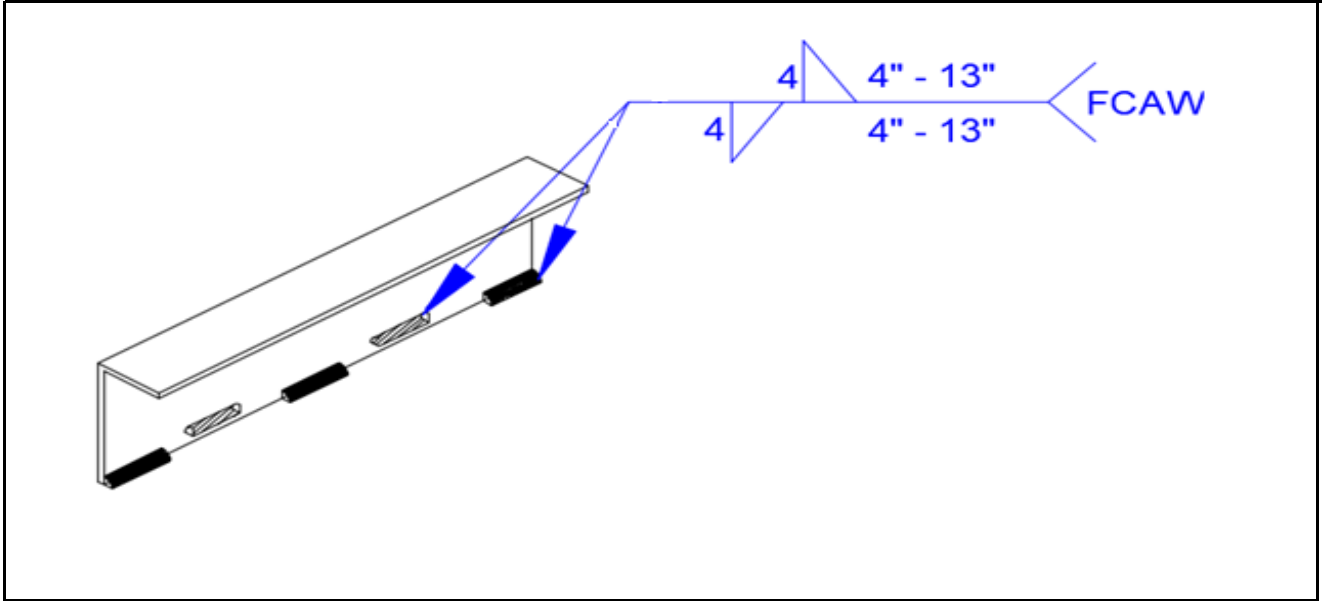

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	JT	1610	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	JT	1610	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
3		J-3	JT	1610	JLV	FCAW	4	6	27/02/2025	OK	-
4		J-4	JT	1610	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
5		J-5	JT	1610	JLV	FCAW	4	6	27/02/2025	OK	-
6		J-6	JT	1610	JLV	FCAW	4	6	27/02/2025	OK	-
7		J-7	JT	1610	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
8		J-8	JT	1610	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION		INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G R GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

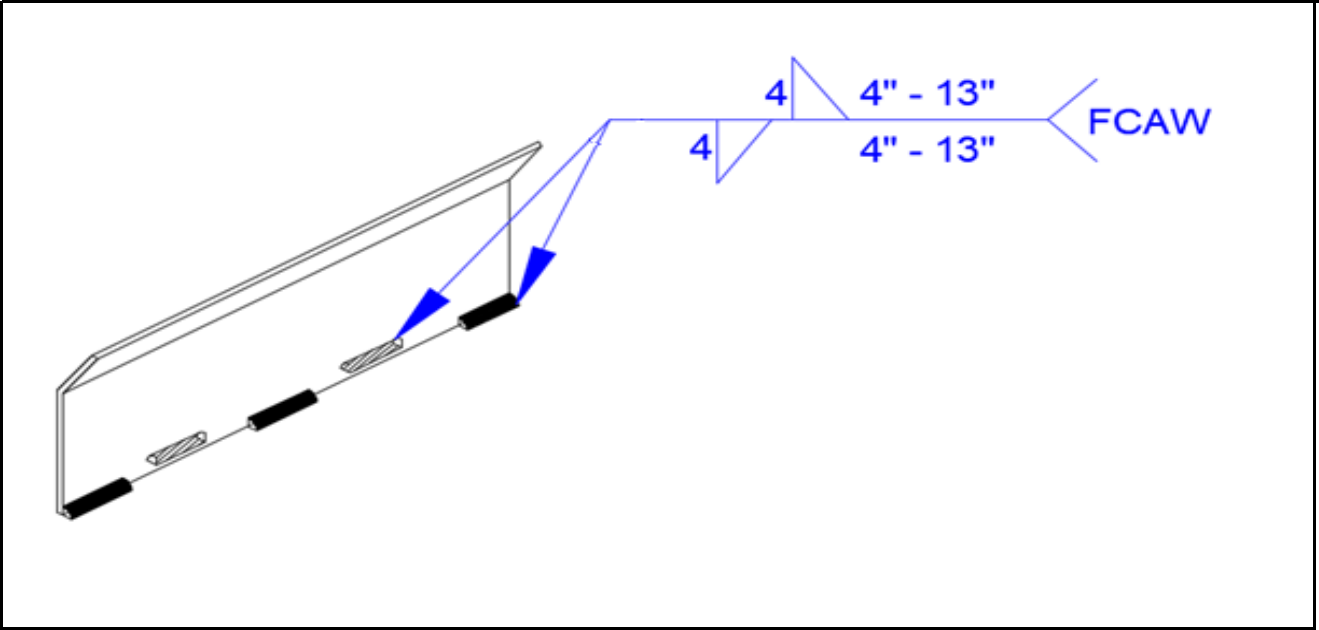

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	JT	300	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	JT	300	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
3		J-3	JT	300	JLV	FCAW	4	6	27/02/2025	OK	-
4		J-4	JT	300	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
5		J-5	JT	300	JLV	FCAW	4	6	27/02/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION		INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	GCH R
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

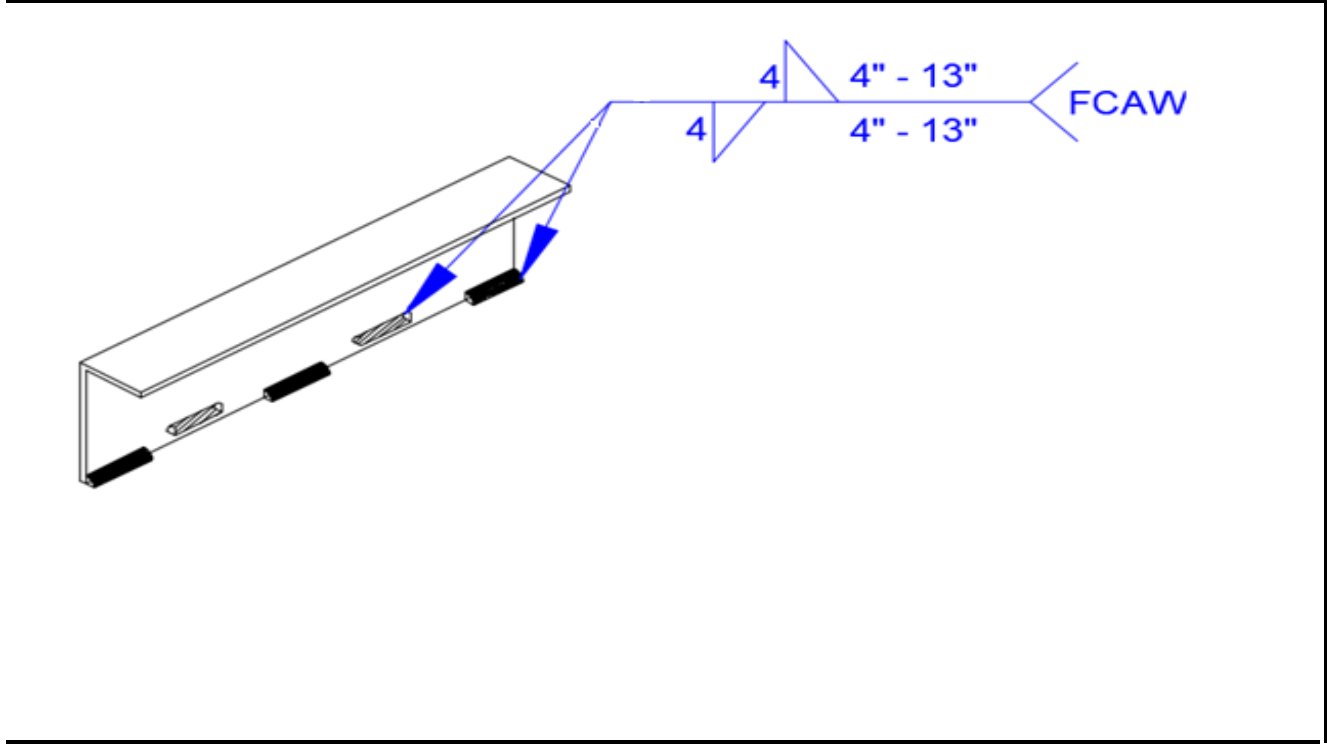


ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	480	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	480	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
3		J-3	J-T	480	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
4		J-4	J-T	480	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
5		J-5	J-T	480	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
6		J-6	J-T	480	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
7		J-7	J-T	480	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
8		J-8	J-T	480	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION			INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	R G	GCH
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

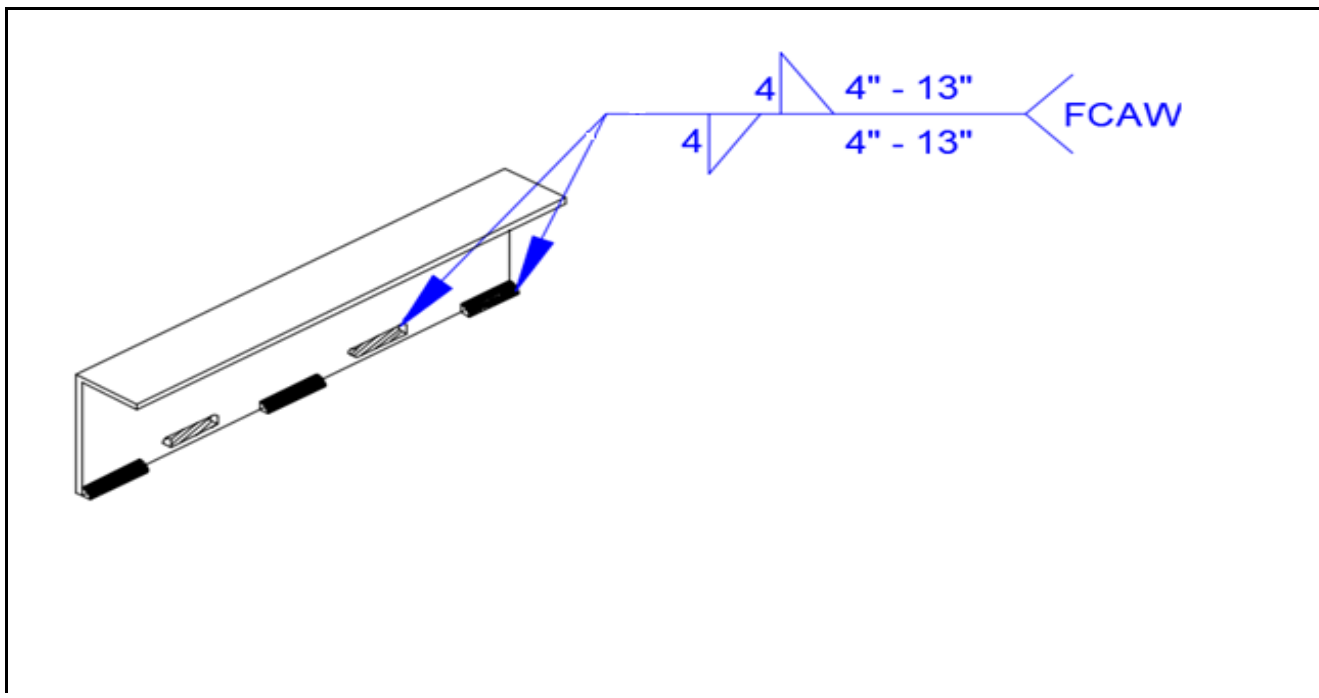

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135	J-1	J-T	2570	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	2570	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
3		J-3	J-T	2570	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
4		J-4	J-T	2570	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
5		J-5	J-T	2570	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
6		J-6	J-T	2570	JLV	FCAW	4	4	27/02/2025	OK	-
7		J-7	J-T	2570	JLV	FCAW	4	5	27/02/2025	OK	-
											-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION				INSTRUMENTOS AUXILARES
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	R	GCH	G
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

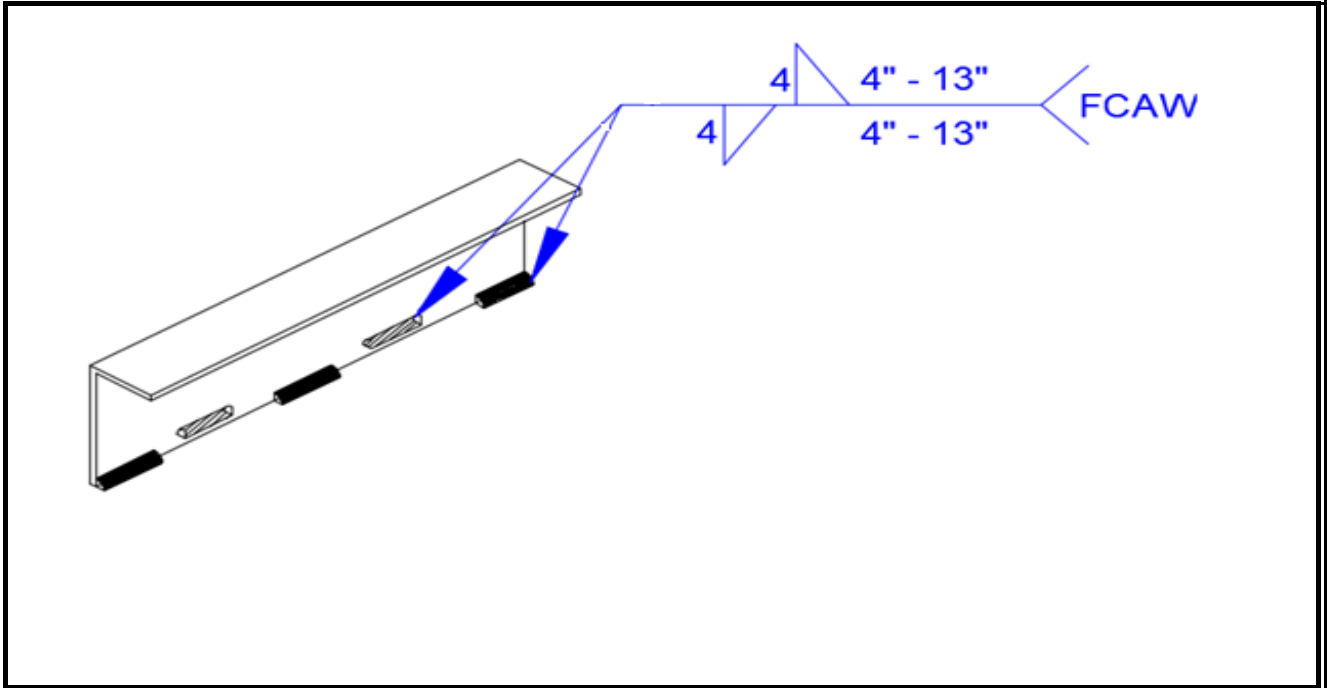

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-90°	J-1	J-T	2620	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA- RG-005	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES					-
METODO DE INSPECCION	ILUMINACION				INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS		G R GCH	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
PALETA	ASTM-A-36	RTB-03-SECT-A	3//16	ASME B313	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

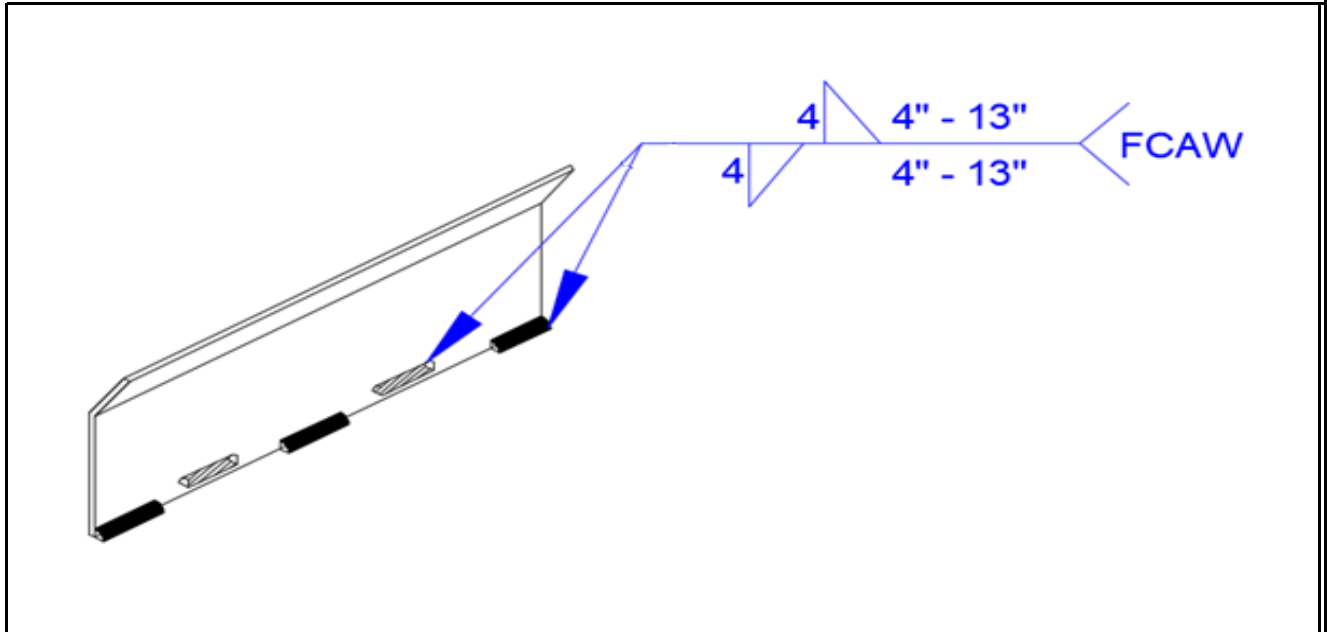

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-A-135°	J-1	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
2		J-2	J-T	250	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-
3		J-3	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
4		J-4	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
5		J-5	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
6		J-6	J-T	250	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-
7		J-7	J-T	250	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-
8		J-8	J-T	250	JLV	FCAW	4	6	27/0/2025	OK	-
9		J-9	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
10		J-10	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
11		J-11	J-T	250	JLV	FCAW	4	5	27/0/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								
