


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025		
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			COD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 23/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002		

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN			
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	TUBERIA DE VAPOR	3.9MM		ASME B313			

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

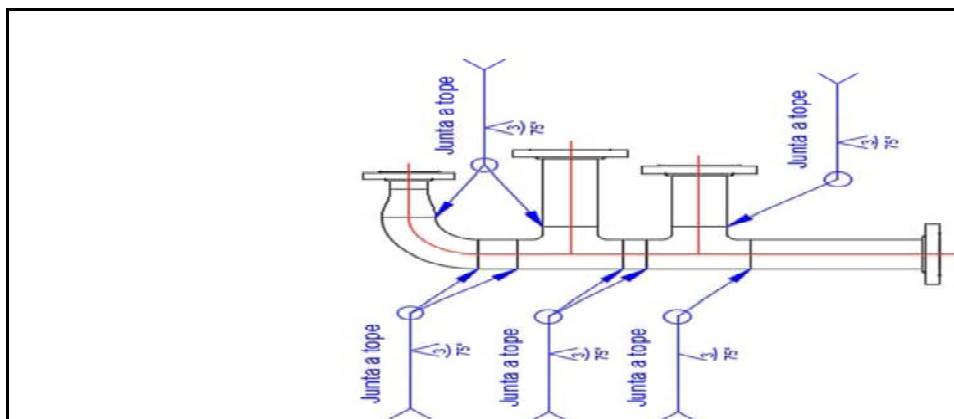

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADO	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTA DO	OBSEBAC ION
							MINIMO	MAXIMO			
1	TB-D ALM D VPR-1	J-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-3	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-4	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-5	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-6	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-7	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-8	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

Pag 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 23/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES									
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN			
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL			CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	TUBERIA DE VAPOR	3.9MM			ASME B313		

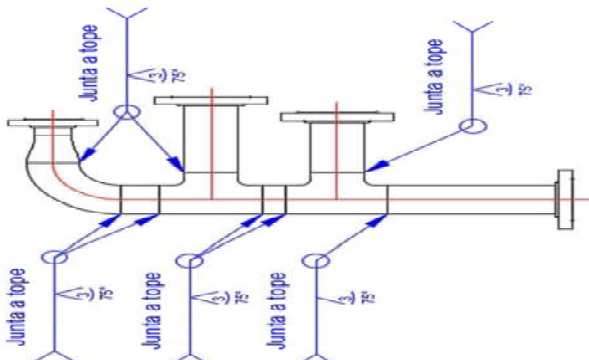ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA									
									

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADO	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTA DO	OBSEBAC ION
							MINIMO	MAXIMO			
2	TB-D ALM D VPR-2	J-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-3	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-4	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-5	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-6	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-7	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-8	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025		
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			COD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 23/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002		


CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN			
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	TUBERIA DE VAPOR	3.9MM		ASME B313			

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

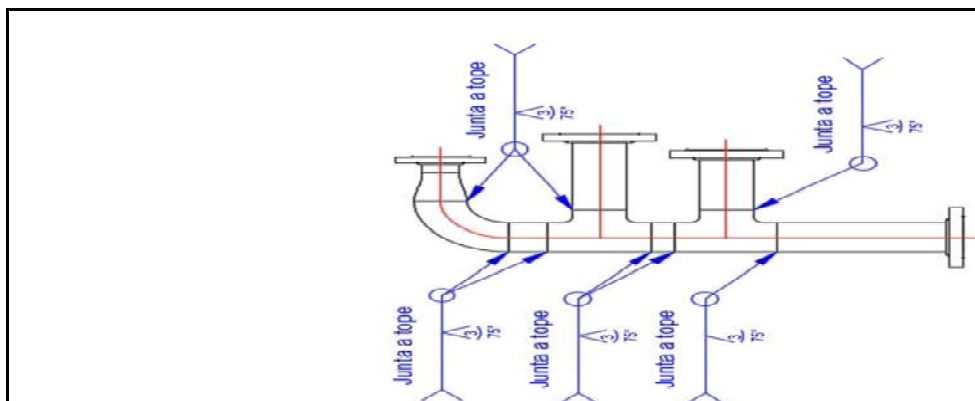

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADO	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
3	TB-D ALM D VPR-3	J-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-3	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-4	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-5	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-6	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-7	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-8	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE SOLDEO DE TUBERIAS DE VAPOR	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA




SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR




SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR

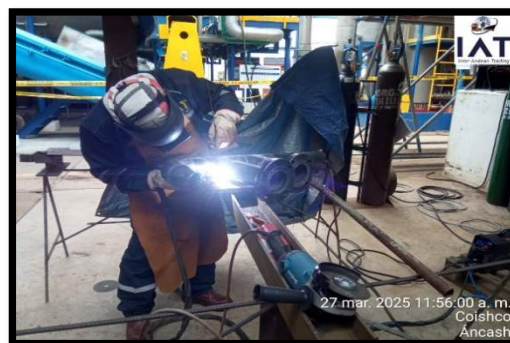


SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 26/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : TUBERIA	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ		
ESPESOR MATERIAL : GTAW	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : TDV		

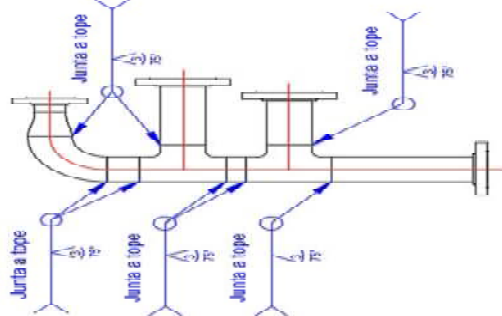2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : GTAW		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		


4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TDV	ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 26/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : TUBERIA	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ		
ESPESOR MATERIAL : GTAW	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-23YWPB	COD. INSPECCIÓN : TDV		

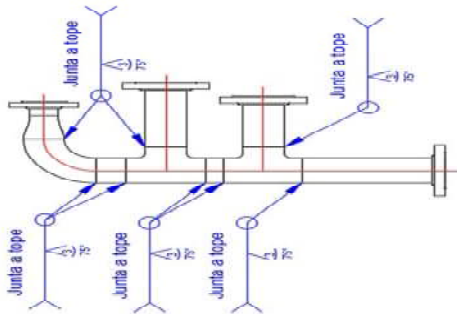2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : 3.4		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TDV	ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 26/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN


ELEMENTO / CONJUNTO : TUBERIA	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ
ESPESOR MATERIAL : 3.4	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL
MATERIAL BASE : ASTM-A-23YWPB	COD. INSPECCIÓN : TDV

2. DATOS DE LA PRUEBA

LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.
PROCESO DE SOLDADURA : GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR

3. MÉTODO DE INSPECCIÓN

TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO
APLICACIÓN : ESPRAY
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS

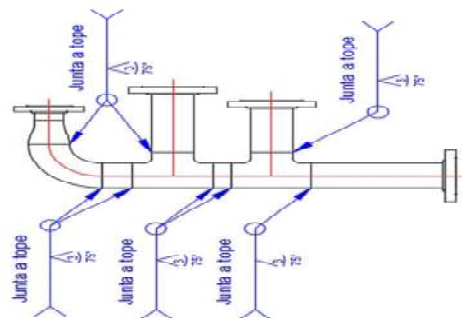

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TDV	ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TDV	ATOPE	89	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	 Pag. 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa	: Porosidad	: Inclusión de Escoria Alineada	D	: Falta de Penetración
Bc	: Inclusión de Escoria	: Grietas Logitudinales	F	: Socavación
Ba	: Inclusión de Escoria Dispersa	: Falta de Fusión	Eb	: Grietas Transversales
Rd	: Redondeada	: Lineal	Ok	: Conforme

6. COMENTARIOS

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT-EN TUBERIA DE VAPOR -01



PT-EN TUBERIA DE VAPOR -02



PT-EN TUBERIA DE VAPOR -01




PT-EN TUBERIA DE VAPOR -03

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/03/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 31/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

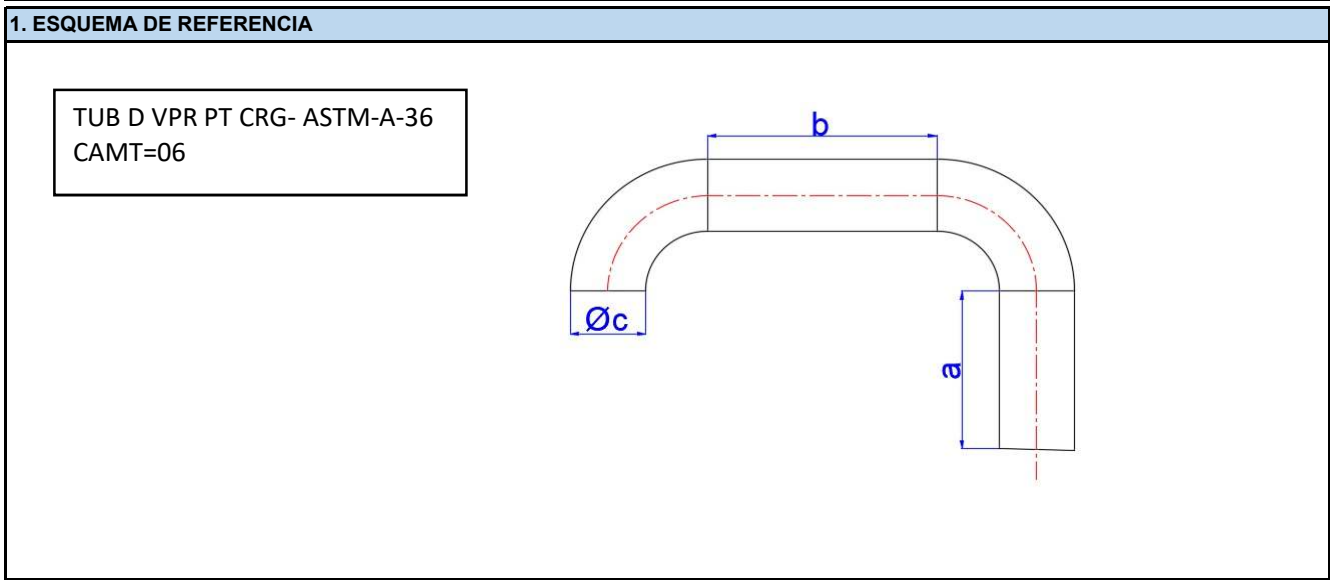

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
			Plano	250	351	114	M.Cald	AC/RE
1	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-1	Canpo	250	351	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-2	Canpo	250	351	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
3	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-3	Canpo	250	351	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
			Plano	250	476	114	M.Cald	AC/RE
1	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-1	Canpo	250	476	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-2	Canpo	250	476	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
3	31/03/2025	TUB D VPR PT CRG-2	Canpo	250	476	114	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente						

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



TUBERIA DE VAPOR 01 PARTE CARGA



TUBERIA DE VAPOR 02 PARTE CARGA



TUBERIA DE VAPOR 03 PARTE



TUBERIA DE VAPOR 04 PARTE CARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		
