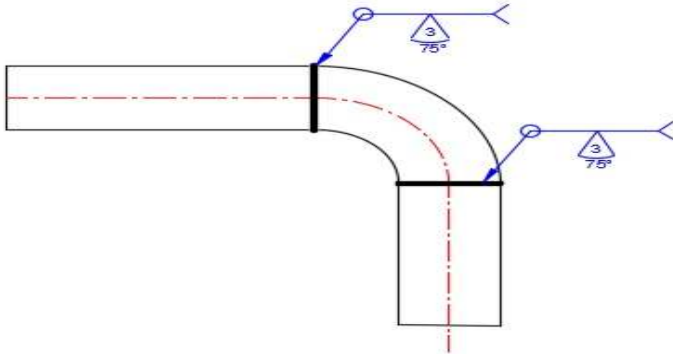


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

Pag 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 23/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES									
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN			
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
TUBERIA DE VAPOR PARTE CARGA		ASTM-A-234WPB	TUBERIA DE VAPOR	3.9MM		ASME B313			
ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA									
									

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDAD	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTA DO	OBSEBAC ION
							MINIMO	MAXIMO			
1	TB D VPR PT CG-01	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
2	TB D VPR PT CG-02	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
3	TB D VPR PT CG-03	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
4	TB D VPR PT CG-04	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
5	TB D VPR PT CG-05	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	4	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
6	TB D VPR PT CG-06	J-1	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	114	B-M	GTAW	3	5	23/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE SOLDEO DE TUBERIAS DE VAPOR	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 23/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR




SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 23/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN


ELEMENTO / CONJUNTO : TUBERIA	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ
ESPESOR MATERIAL : GTAW	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : TB D VP PT CG

2. DATOS DE LA PRUEBA

LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.
PROCESO DE SOLDADURA : GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR

3. MÉTODO DE INSPECCIÓN

TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO
APLICACIÓN : ESPRAY
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS

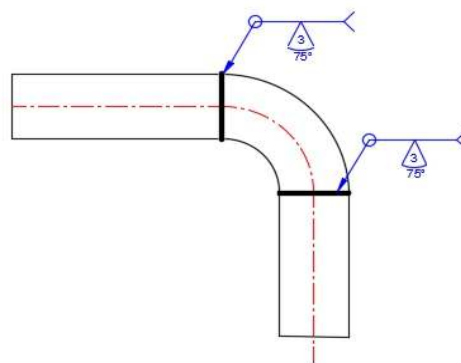

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
2	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
3	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
4	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
5	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
6	TB D VP PT CG	ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		ATOPE	114	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT-EN TUVERIA DE VAPOR -01 PARTE CARGA



PT-EN TUVERIA DE VAPOR -02 PARTE CARGA



PT-EN TUVERIA DE VAPOR -01 PARTE CARGA




PT-EN TUVERIA DE VAPOR -03 PARTE CARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°	FECHA DE CONTROL	: 28/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-AST-QA-PR-002

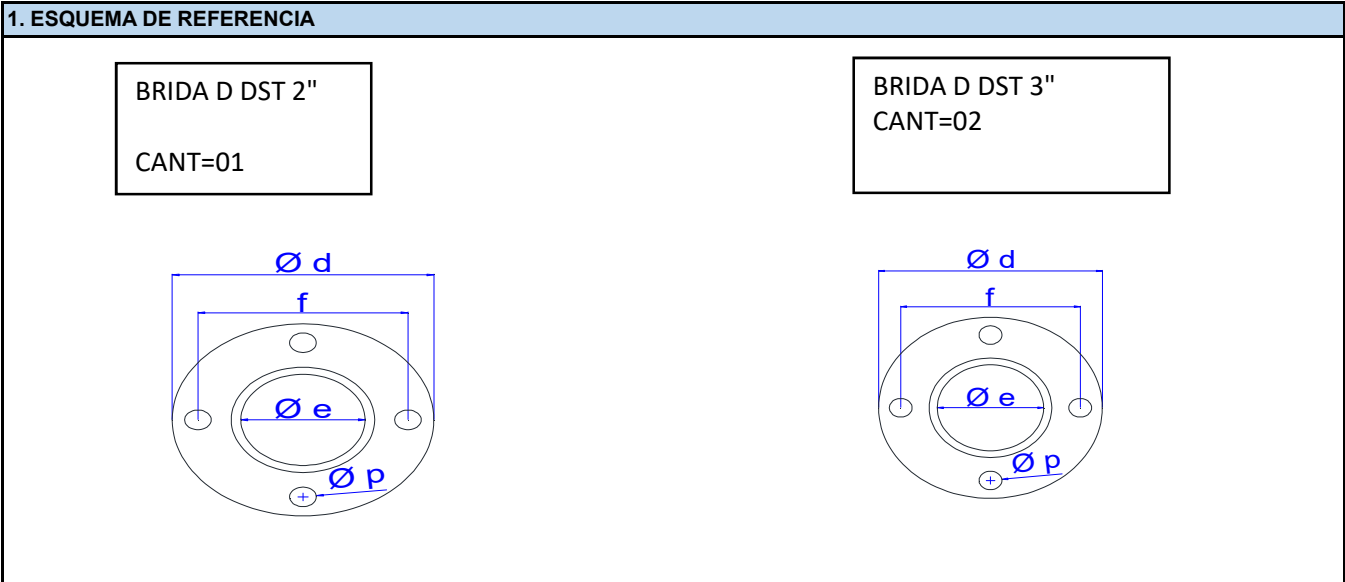

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
1	28/03/2025	BRD D DTRB-2"	Plano	151	70	60	codigo	AC/RE
			Canpo	152	70	60	MC-01	A C
			Δ ±	2	0	0	MC-01	AC
2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
2	28/03/2025	BRD D DTRB-3"	Plano	190	100	90	codigo	AC/RE
			Canpo	190	100	90	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	MC-01	AC
2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
3	28/03/2025	BRD D DTRB-3"	Plano	190	100	90	codigo	AC/RE
			Canpo	190	100	90	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 28/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



BRIDADE 3" DE DISTRIBUDOR



BRIDADE 3" DE DISTRIBUDOR



BRIDADE 2" DE DISTRIBUDOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 28/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN
FRIDAS DE DISTRIBUIDOR		ASTM-A-234WPB	DISTRIBUIDOR	165MM		ASME B313

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

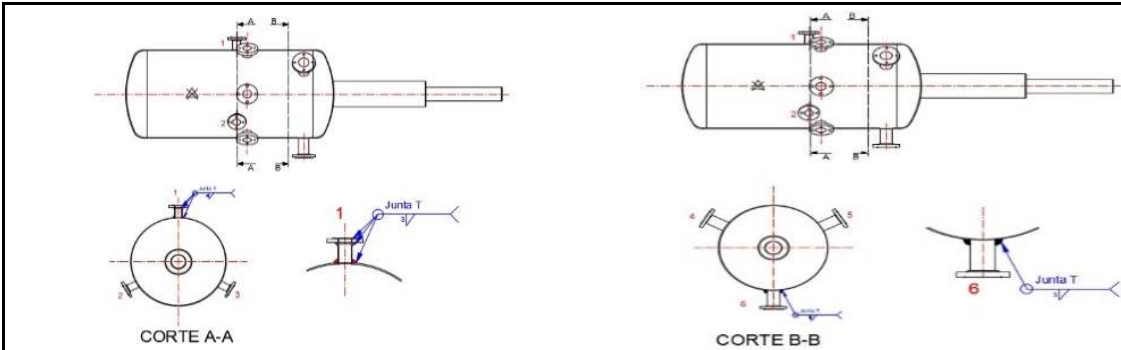

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDA	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	BD DE DSTD 2"	J-1	J-T	62	B-M	GTAW	3	4	28/03/2025	OK	-
2	BD DE DSTD 3"	J-2	J-T	90	B-M	GTAW	3	3	28/03/2025	OK	-
3	BD DE DSTD 3"	J-3	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	28/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE SOLDEO DE BRIDAS DEL DESTRIADOR	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 28/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 28/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : DISTRIBUDOR	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ		
ESPESOR MATERIAL : GTAW	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-23YWPB	COD. INSPECCIÓN : BD D DSTB		

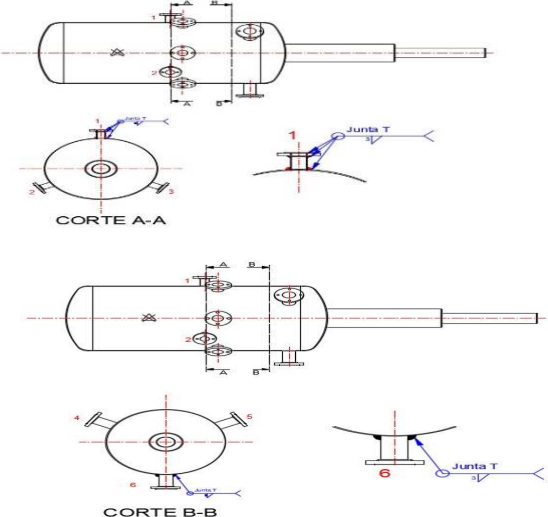2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : GTAW		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	BD D DSTB	J-T	62	B-M	-	-	-	CONFORME	-
2	BD D DSTB	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
3	BD D DSTB	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

SE REALISO CAMBIO DE BRIDAS A DISTRIBUDOR SE CANBIARO 3 BRIDAS

1-BRIDA DE 2" Y

2 BRIDAS DE 3" Y SE REALISO LOS ENSAYOS DE PT SALIENDO LOS RESULTADOS EN MUY BUENAS CONDISIONES

ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT-EN BRIDA DE DISTRIBUDOR



PT-EN BRIDA DE DISTRIBUDOR



PT-EN BRIDA DE DISTRIBUDOR



PT-EN BRIDA DE DISTRIBUDOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		
