

	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. <i>Auditores Serenos Company</i>
	ÁREA DE INSPECCIÓN: SALA DE MÁQUINAS RSW		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 23-09-22	
	ÁREA: SALA DE MÁQUINAS RSW	NÚMERO DE HALLAZGO: 18	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA DESPEGADA	Se requiere que la señalización este pegada de manera correcta, realizar el mantenimiento	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
2	GABINETE PRESENTA CABLE DE TIERRA COLOR NEGRO	Se requiere identificar y rotular el cable de tierra con cinta verde con amarilla	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
3	GABINETE NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METÁLICA	Se requiere la instalación de un cable de tierra para aterra la puerta metalica del gabinete, este cable deberá ser conectado a la barra de tierra y de color amarillo o verde con amarillo	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
4	GABINETE PRESENTA CABLES FUERA DE CANALETAS ELÉCTRICAS	Se requiere ordenar los cables dentro de las canaletas eléctricas, sujetar con cintillo y acomodarlos dentro de las canaletas y poner las tapas a estas	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
5	BOMBA NO PRESENTAN CABLE DE TIERRA	Las bombas no presentan cable de tierra, se requiere la instalación de cables de tierra para cada bomba y conectarlas a la barra de tierra y rotularla de acuerdo a la bomba que pertenesca	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
6	CIRCUITOS DE LOS GABINETES NO PRESENTAS CABLES DE TIERRA	Se requiere indentificar los cables de tierra de cada circuito y conectarlo a la barra de tierra del gabinete, los circuitos que no tengan cables de tierra se les deberá instalar.	Tablero compresor de Tornillo T-RSW-1
7	GABINETE NO PRSENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN SU PUERTA	Se requiere rotular el gabinete con señalización de riesgo o peligro de manera que sea visible en la puerta del gabinete	Tablero de bombas T-RSW-2
8	GABINETE PRESENTA CABLES SUELTOS FUERA DE BANDEJA	Se requiere ordenar los cables dentro de las canaletas eléctricas, sujetar con cintillo y acomodarlos dentro de las canaletas y poner las tapas a estas	Tablero de bombas T-RSW-2
9	BOMBAS NO PRESENTAN CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación de los cables de tierra para cada bomba, estos cables deberán conectarse a la barra de tierra tienen que se color amarillo o verde con amarillo	Tablero de bombas T-RSW-2
10	GABINETE NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METÁLICA	Se requiere la instalación de un cable de tierra para aterra la puerta metalica del gabinete, este cable deberá ser conectado a la barra de tierra y de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de bombas T-RSW-2
11	CIRCUITOS DE GABINETE NO PRESENTAN CABLES DE TIERRA	Se requiere rotular los cables de tierra del gabinete identificando a que circuito pertenecen, los circuitos que no tengan	Tablero de bombas T-RSW-2
12	SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA DESPEGADANDOSE	Se requiere que la señalización este pegada de manera correcta, realizar el mantenimiento	Tablero de bombas T-RSW-2
13	TABLERO NO PRESENTA BORNES DE TIERRA	Se requiere la instalación de bornes de tierra para conectar el cable de tierra del tablero	Tablero medidor de Bombas Pejerrey T-RSW-3
14	TABLERO NO TIENE CABLE DE TIERRA PARA SISTEMA DE PANEL	Se requiere la instalación del cable de tierra desde un punto de tierra mas cercano. Este cable debera ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero medidor de Bombas Pejerrey T-RSW-3
15	GABINETE PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO SIN CONEXIÓN A BARRA DE TIERRA	Se requiere instalar un cable de tierra para realizar conexión entre el cable de aterramiento de la puerta del gabinete a la barra de tierra	Tablero de Fuerza y Control Bomba descarga respaldo RSW T-RSW-4
16	GABINETE PRESENTA PEQUEÑO ROLLO DE CABLE COLGANDO	Se requiere acomodar el cable de manera que no este en esa ubicación ya que podría entorpecer el cerrar el tablero	Tablero de Fuerza y Control Bomba descarga respaldo RSW T-RSW-4
17	CABLES DE TIERRA SIN ROTULAR DE ACUERDO AL CIRCUITO QUE PERTENECEN	Se requiere identificar y rotular cada cable de tierra con el circuito al que pertenece, para facil identificación	Tablero de Fuerza y Control Bomba descarga respaldo RSW T-RSW-4
18	REJA DE ACCESO A LA SALA DE MAQUINAS DEL RSW P	Se requiere mejorar la reja al acceso de la sala de máquinas, debido a que esta descuadrado y no se abre con facilidad, se debe forzarla para poder ingresar.	Tablero de Fuerza y Control Bomba descarga respaldo RSW T-RSW-4

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Ítem 1




Ítem 2



Ítem 3



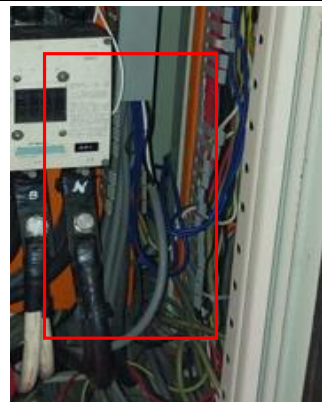Ítem 3




Ítem 4




Ítem 5,6



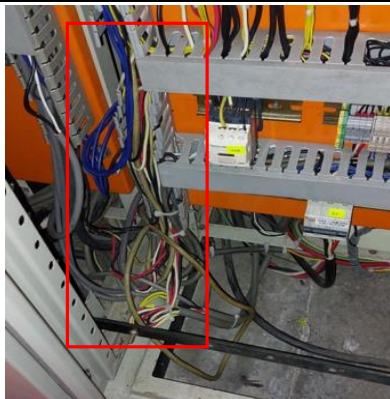Ítem 7



Ítem 8

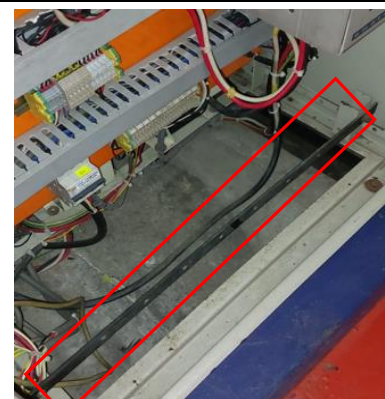

Ítem 9,11







Ítem 10



Ítem 10



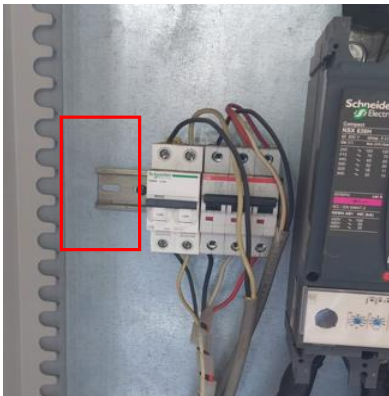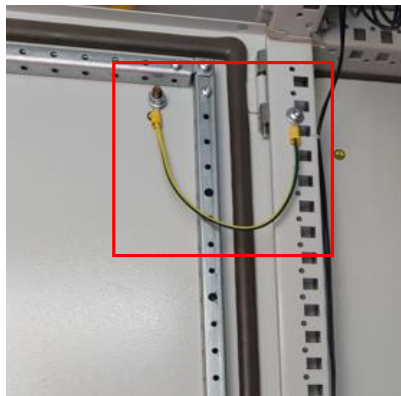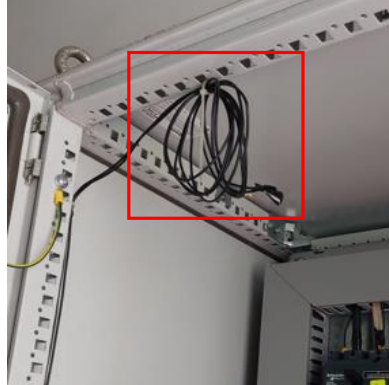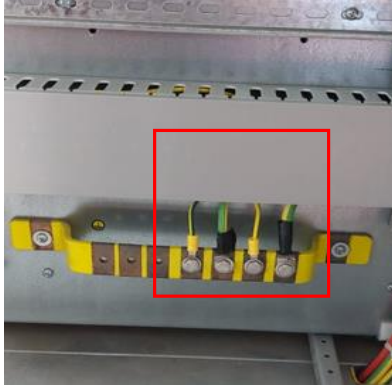Ítem 12

			
Ítem 13	Ítem 14	Ítem 15	
			
Ítem 16	Ítem 17		
Elaborado por:	Ronald Cama		Departamento de Ingeniería
Revisado por:	Ing. Jorge Álvarez		
