


 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company
	ÁREA DE INSPECCIÓN: TDF - PUNTA PEJERREY		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 26-09-22	
	ÁREA: TDF - PUNTA PEJERREY	NÚMERO DE HALLAZGO: 34	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	PUERTA DE INGRESO AL TDF-PUNTA PEJERREY NO CUENTA CON ROTULACIÓN DE NOMBRE DE LA ZONA	Se requiere rotular la puerta de ingreso con el nombre de la zona o área en este caso TDF-PUNTA PEJERREY	TDF - PUNTA PEJERREY
2	PUERTA DE INGRESO AL TDF-PUNTA PEJERREY NO CUENTA CON ROTULACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO O RIESGO ELÉCTRICO	Se requiere rotular la puerta de ingreso al TDF-PUNTA PEJERREY con señalización de riesgo o peligro eléctrico, como medida de seguridad	TDF - PUNTA PEJERREY
3	BANDEJAS ELÉCTRICAS NO CUENTAN CON CABLE DE ATERRAMIENTO METÁLICO CONECTADO A TIERRA	Se requiere la instalación del cable de aterramiento electrico para las bandejas portacables del TDF-PUNTA PEJERREY como medida de protección	TDF - PUNTA PEJERREY
4	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN INDICANDO NOMBRE Y NIVEL DE TENSIÓN PARA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN EN SU PUERTA	Se requiere rotular el tablero indicando el nombre del tablero y nivel de tensión para su fácil identificación.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
5	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO O RIESGO ELECTRICO EN SU PUERTA	Se requiere rotular el tablero con señalizacioón de riesgo o peligro a choque eléctrico, como medida de seguridad preventiva.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
6	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA PARA ATERRAMIENTO PARA LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL TABLERO	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para la conexión de los cables de tierra del tablero.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
7	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN NO PRESENTA ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial para el circuito diferencial como medida de protección.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
8	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO PRESENTA ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial para el circuito de tomacorrientes.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
9	CABLE ENROLLADO COMO RESERVA	Si no se requiere el uso del cable que se encuentra enrollado se debe retirar.	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
10	CABLES DE TIERRA ENREDADOS, NO SE IDENTIFICA A QUE CIRCUITO PERTENENCEN	Se requiere identificar y rotular los cables de tierra existentes a los circuitos que pertenescan,	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
11	CABLES FUERA DE LA CANALETA ELECTRICA	Se requiere un ordenamiento de los cables, agruparlos por circuitos sujetandolo con cintillo para mejor fijación	Tablero de bomba de Achique, Cloro N°1 - N°2 T-PEJ-3
12	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE DE TABLERO NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere rotular el tablero indicando el nombre del tablero y nivel de tensión para su fácil identificación.	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
13	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO O RIESGO ELECTRICO EN SU PUERTA O UBICACIÓN CERCANA AL TABLERO	Se requiere rotular el tablero con señalizacioón de riesgo o peligro a choque eléctrico, como medida de seguridad preventiva.	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
14	TABLERO NO PRESENTA BORNES DE TIERRA	Se requiere la instalación de bornes de tierra para la conexión con el cable de tierra	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
15	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación de un cable de tierra desde el tablero o pozo a tierra mas cercano. Este cable deberá estar conectado al borne de tierra	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
16	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METÁLICA	Se requiere la instalación del cable de aterramiento eléctrico para la puerta metálica del tablero. Este cable debera ser conectado al borne de tierra del tablero, el cable deberá ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
17	LIMPIEZA INTERIOR DEL TABLERO	Se requiere realizar una limpieza al interior del tablero, debido a que presenta polvo.	Tablero de control de bombas T-PEJ-4
18	GABETA NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO	Se requiere realizar la rotulación de la gabeta con señalización de riesgo o peligro en la puerta de la gabeta	Tablero de bombas chinas T-PEJ-1

19	GABETA PRESENTA ROTULACIÓN CON TAMAÑO DE LETRAS PEQUEÑAS Y DESPEGÁNDOSE	Se requiere realizar un cambio en la rotulaciones con letras de mayor tamaño y que no esten despegandose	Tablero de bombas chinas T-PEJ-1
20	GABETA NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METÁLICA	Se requiere la instalación del cable de aterramiento eléctrico para la puerta metalica del tablero. Este cable debera ser conectado a la barra de tierra del tablero, el cable deberá ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de bombas chinas T-PEJ-1
21	GABETA NO TIENE MANDIL DE SEGURIDAD	Se requiere la instalación de un mandil de seguridad dentro de la gabeta, para evitar el contacto directo y ocasionar accidentes	Tablero de bombas chinas T-PEJ-1
22	GABETA NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO	Se requiere realizar la rotulación de la gabeta con señalización de riesgo o peligro en la puerta de la gabeta	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
23	GABETA PRESENTA ROTULACIÓN CON TAMAÑO DE LETRAS PEQUEÑAS Y DESPEGÁNDOSE	Se requiere realizar un cambio en la rotulaciones con letras de mayor tamaño y que no esten despegandose	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
24	GABETA NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METÁLICA	Se requiere la instalación del cable de aterramiento eléctrico para la puerta metalica del tablero. Este cable debera ser conectado a la barra de tierra del tablero, el cable deberá ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
25	GABETA NO TIENE MANDIL DE SEGURIDAD	Se requiere la instalación de un mandil de seguridad dentro de la gabeta, para evitar el contacto directo y ocasionar accidentes	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
26	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE COLOR NEGRO Y BLANCO	Se requiere que los cables de tierra conectados a la barra sean de color amarillo o verde con amarillo, en este caso se cubrira con cinta verde y amarilla los cables conectados de diferente color	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
27	ROTULAR E IDENTIFICAR LOS CABLES DE TIERRA CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRA	Se requiere identificar y rotular los cables de tierra existentes indicando a que bomba pertenece cada cable de tierra, de faltar un cable de tierra se requiere instalar un cable de tierra de color verde o amarillo	Tablero de bombas de conservas T-PEJ-2
28	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN	Se requiere rotular el tablero indicando el nombre del tablero y nivel de tensión para su fácil identificación.	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
29	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO EN SU PUERTA	Se requiere rotular el tablero con señalización de riesgo o peligro a choque eléctrico, como medida de seguridad preventiva.	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
30	TABLERO NO PRESENTA UN ITM PRINCIPAL	Se requiere la instalación de un ITM general para el tablero	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
31	TABLERO NO PRESENTA ITM DIFERENCIAL PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES	Se requiere la instalación de un ITM diferencial, este debe ser conectado despues el ITM principal a instalar en el tablero	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
32	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA PARA LA CONEXIÓN DE SUS CIRCUITOS	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para la conexión de los cables de tierra del tablero.	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
33	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación del cable de tierra de alimentación para el tablero, este cable debe ir conectado a la barra de tierra tiene que ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
34	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO PRESENTAN CABLES DE TIERRA	Se requiere la instalación de los cables de tierra para cada circuito de tomacorrientes industriales, estos deberan ser conectados a la barra de tierra a instalar, deberán ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de tomacorrientes - Sala de Bombas de agua de mar T-PEJ-3.2
35	CASETA DE SEGURIDAD NO PRESENTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, AHORA ESTA CONECTADA DE MANERA DIRECTA SIN NINGUN TIPO DE PROTECCIÓN	Se requiere realizar la implementación del tablero de distribución para la caseta de seguridad con todos los implementos de seguridad	Tablero de distribución de Caseta de Seguridad T-PEJ-3.1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Ítem 1,2

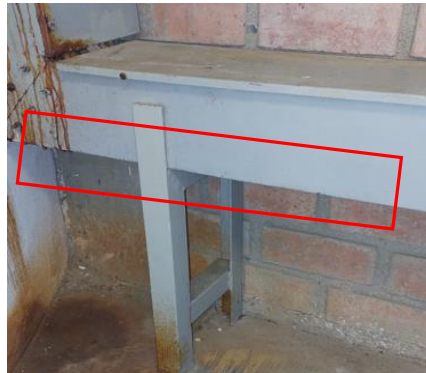

Ítem 3




Ítem 3




Ítem 3




Ítem 4,5

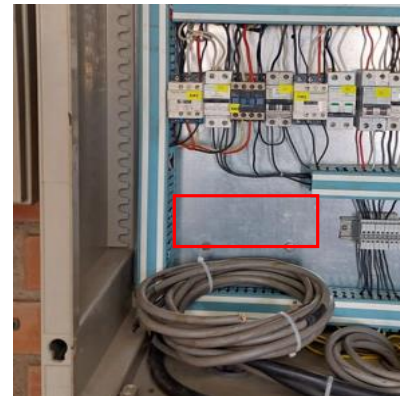


Ítem 6

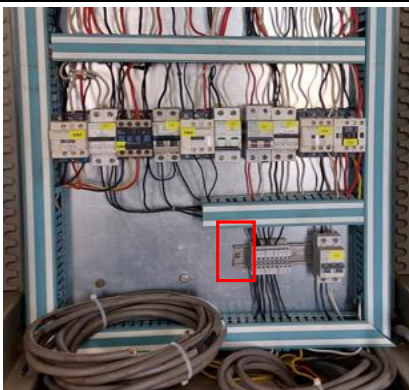


Ítem 7

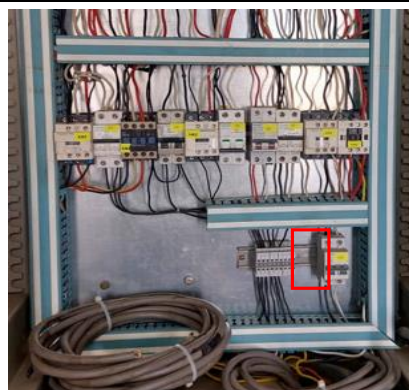


Ítem 8

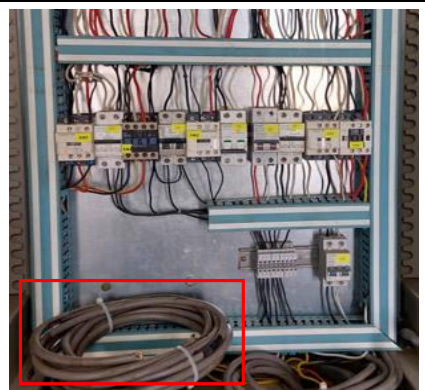

Ítem 9

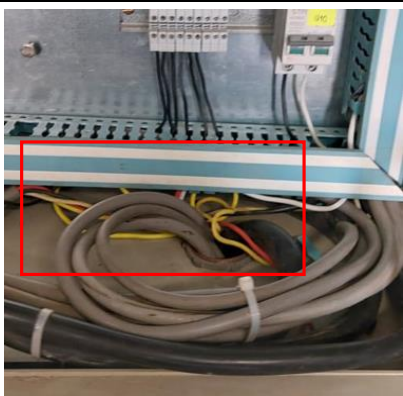

Ítem 10

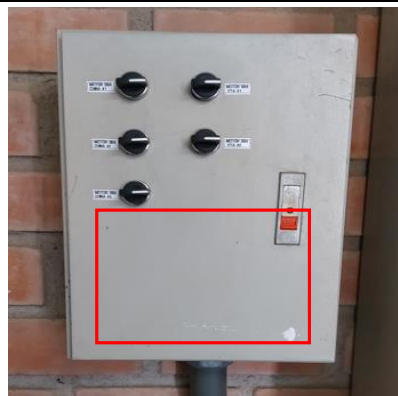

Ítem 12,13



Ítem 14




Ítem 15



Ítem 16



Ítem 18,19

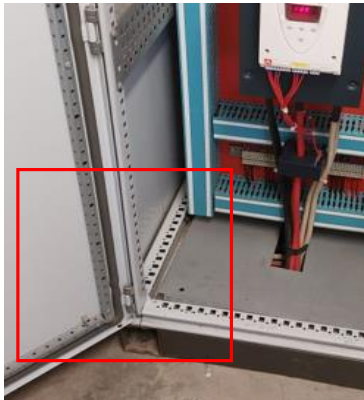


Ítem 20




Ítem 21




Ítem 22,23

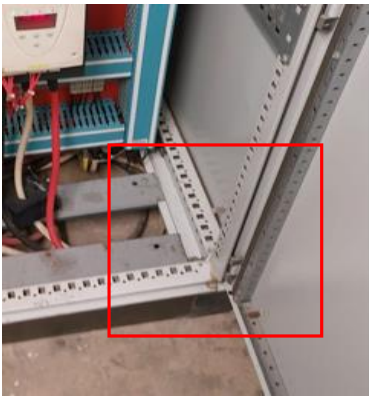


Ítem 24

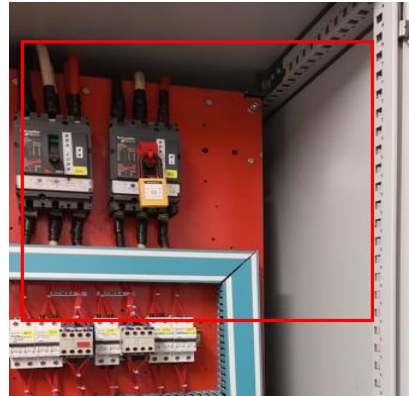


Ítem 25

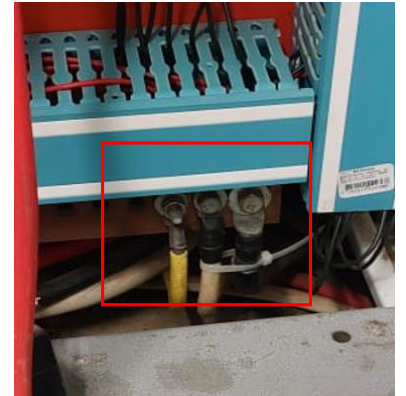


Ítem 26,27

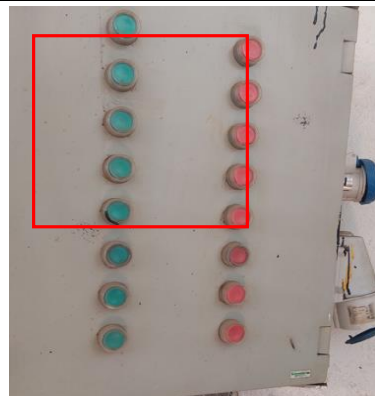





Ítem 28,29

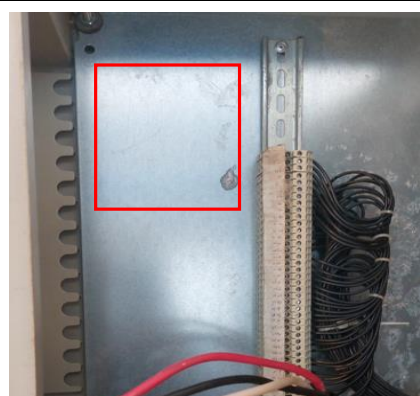

Ítem 30

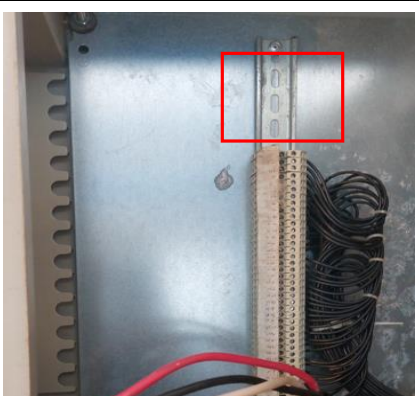

Ítem 31

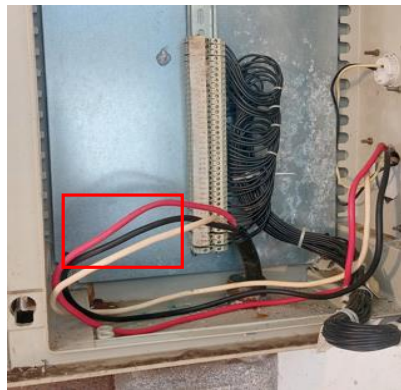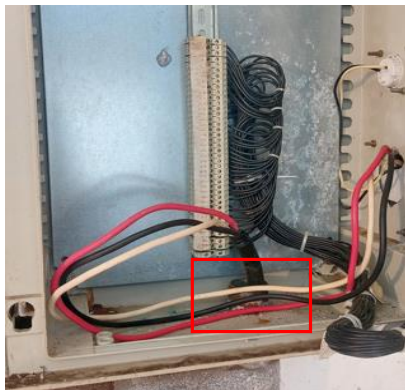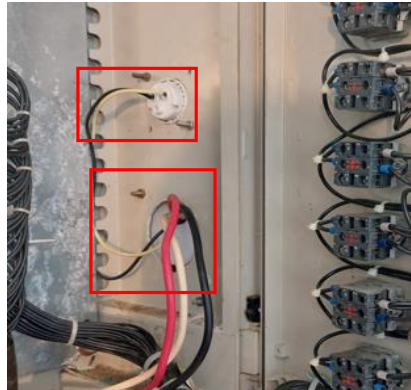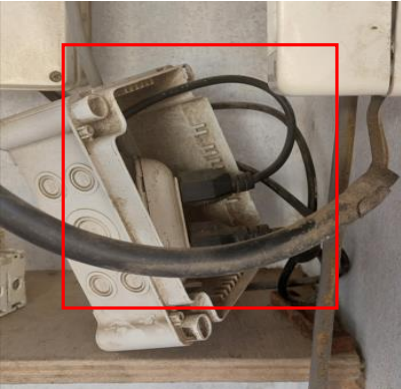			
Ítem 32	Ítem 33	Ítem 34	
			
Ítem 35	Ítem 35		
Elaborado por:	Ronald Cama		Departamento de Ingeniería
Revisado por:	Ing. Jorge Álvarez		
